



**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA  
E ESGOTO DE TAQUARITINGA**

PROCESSO Nº. **26/2013**

## **T.P. nº 01/2013**

Regido pela Lei nº 8.666/1993.  
MENOR PREÇO GLOBAL

**Objeto:**

Contratação de empresa de engenharia para prestação de serviços técnicos especializados no Gerenciamento de Obras de Saneamento/Esgotos/Estação de Tratamento - ETE, incluindo todas as despesas com recursos humanos e materiais (inclusive veículos e insumos para transporte de pessoas), despesas diretas e indiretas (inclusive escritório para administração local e insumos), impostos e lucros.

Local: Rua Clineu Braga de Magalhães, nº 911 - Centro  
Taquaritinga/SP

**9º Vol.**

São Paulo, 12 de Setembro de 2.014.

Ao

**Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Taquaritinga - SAAET**  
Rua Clíneu Braga de Magalhães, 911  
CEP 15900-000 - Centro  
Taquaritinga - SP

At.: Satoshi Yokoyama  
Superintendente

Ref.: Contrato nº 045/2013 - Prestação de serviços técnicos especializados de engenharia no Gerenciamento de Obras de Saneamento / Esgotos / Estação de Tratamento - ETE

Ass.: Medição dos serviços / Medição 08 - Apresentação e pedido de liberação para o pagamento / Envio de nota, guias recolhidas de encargos sociais e tributários

Prezados Senhores (as),


Vimos com o presente, apresentar a V.S.as e solicitar liberação para o pagamento, da Medição 03 dos serviços realizados no mês 08/2.014, correspondentes a R\$ 41.618,88 (quarenta e um mil, seiscentos e dezoito reais e oitenta e oito centavos), conforme desembolso previsto nos Cronogramas Físico e Financeiro do contrato em referência.

Aproveitamos a oportunidade, para encaminhar em anexo:

- Nota de Débito de Serviços Profissionais nº 233 para o pagamento dos serviços prestados;
- Cópias das guias de recolhimentos dos encargos sociais exigíveis - GRF FGTS competência 08/2.014 e GPS INSS competência 07/2.014;
- Cópia da guia de recolhimento do Imposto Sobre Serviços (ISS) incidente no mês 07/2.014, relativa ao 2º Trimestre (Abril, Maio e Junho) de 2.014, a qual reflete a totalidade do referido imposto devido por esta empresa, informando que somos prestadores de serviços inscritos na cidade de São Paulo, sob a forma de sociedades de profissionais, de acordo com Art. 15, da Lei Municipal 13.701/03 (Declaração Cadastral i006328/2014 em anexo) e, na forma definida em lei, conforme Portaria SF 014/2004, o ISS deve ser recolhido trimestralmente (próximo recolhimento: trimestre dos meses 07, 08 e 09/2.014, em 10/10/2.014). Maiores informações, poderão ser obtidas no sítio da PMSP e respectivo endereço: <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/financas/servicos/iss>.

Sendo o que nos apresenta para o momento, despedimo-nos.

Atenciosamente,



Engº Francisco José Justo  
Sócio Gerente

São Paulo, 12 de Setembro de 2.014.

Ao

**Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Taquaritinga - SAAET**

Rua Clineu Braga de Magalhães, 911

CEP 15900-000 - Centro

Taquaritinga - SP

At.: Satoshi Yokoyama  
Superintendente

Ref.: Contrato nº 045/2013 - Prestação de serviços técnicos especializados de engenharia no Gerenciamento de Obras de Saneamento / Esgotos / Estação de Tratamento - ETE

Ass.: Relatório Mensal do Acompanhamento Físico e Financeiro / Apresentação  
Mês 08/2.014 (R0)

Prezados Senhores (as),

Vimos com o presente, encaminhar a VS.as, para apreciação e considerações, 01 (uma) via impressa e 01 (uma) via em arquivo digital (extensão .pdf), do relatório de mensal do acompanhamento físico e financeiro das obras da Estação de Tratamento de Esgotos (ETE), objeto do contrato em referência, conforme discriminação a seguir:

- Relatório Mensal do Acompanhamento Físico e Financeiro – Mês 08/2.014, Revisão 0 (N/Ref.: GE-174-RE-AM-008-R0).

Sendo o que nos apresenta para o momento, despedimo-nos.

Atenciosamente,



Engº Francisco José Justo  
Sócio-Gerente



Pagamentos com código de barras

10/07/2014 20:16:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/07/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 20.16.45  
6806306806

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PERTECNICA C E P S-C LT  
AGENCIA: 6806-3 CONTA: 608-4  
EFETUADO POR: FRANCISCO J JUSTO  
-----  
Convenio PREF MUN SAO PAULO  
Codigo de Barras 81630000006-3 16050000552-7  
01407100700-0 00023543072-5  
Data do pagamento 10/07/2014  
TRIBUTU I.S.S. - AUTO LANÇADO.  
Valor Total 616,05  
-----  
DOCUMENTO: 071001  
AUTENTICACAO SISBB:  
D.283.BD8.06F.024.DAD

Transação efetuada com sucesso por: J1950079 FRANCISCO JOSE JUSTO.

# ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA



A Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento Econômico alerta para o vencimento no dia **10/07/2014** do Imposto Sobre Serviços - ISS devido pelas sociedades de profissionais, inscritas no Cadastro de Contribuintes Mobiliários - CCM, referente ao 2º trimestre de 2014. Para orientá-lo, neste comunicado encontra-se o documento de arrecadação que pode ser pago em qualquer estabelecimento da rede bancária autorizada.

Para efeito de cálculo do imposto devido, é indicado no campo "UNIDADES TAXADAS" o número de profissionais (sócios, empregados ou não) habilitados ao exercício da mesma atividade e que prestam serviços de forma pessoal, em nome da sociedade, assumindo responsabilidade pessoal, nos termos da legislação específica. Calcule-se o valor total a pagar por meio da multiplicação do valor unitário indicado no documento de arrecadação pela quantidade de unidades taxadas. Caso a quantidade de unidades taxadas esteja incorreta, é possível alterá-la e emitir a nova guia de pagamento no DUC.

**Forma de pagamento:** O pagamento poderá ser efetuado na rede bancária autorizada, nos terminais de autoatendimento (caixa eletrônico) ou, ainda, via Internet banking utilizando exclusivamente o código de barras impresso no próprio documento.

Também é possível, mediante sua Senha Web ou certificado digital, acessar o **Demonstrativo Unificado do Contribuinte - DUC** no endereço <http://www.prefeitura.sp.gov.br/duc>. O DUC fornece:

- Informações sobre valores pagos relativos ao IPTU, ao ISS, à TFA, à TRSS e à TFE;
- Extrato atualizado dos débitos do contribuinte;
- Possibilidade de emissão de novo documento de arrecadação para pagamento **após o vencimento** ou **em faixa de recolhimento diversa do sugerido neste documento**.

Caso não possua acesso ao DUC, acessar <http://www.prefeitura.sp.gov.br> para emissão do novo documento de arrecadação. Sobre os pagamentos em atraso incidirão acréscimos legais, que serão calculados automaticamente no momento da emissão do documento.

Para informações adicionais, acessar o link: <http://www.prefeitura.sp.gov.br/sup>

Atendimento telefônico: 156

Atendimento presencial: Praça de Atendimento da Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento Econômico, localizada no Vale do Anhangabaú, 206/226 (ao lado do Viaduto do Chá). Horário de atendimento: de 2ª a 6ª feira, das 8h às 18h.

Caso o pagamento já tenha sido efetuado, desconsiderar este comunicado.

A falta de pagamento do tributo nos prazos regulamentares sujeita a inclusão do nome do contribuinte no Cadastro Informativo Municipal - CADIN MUNICIPAL, nos termos da Lei nº 14.094, de 06/12/05.

0020762

20645 22141049 2

Emissão: 06/06/2014

## ISS 2014 - SOCIEDADE DE PROFISSIONAIS

CCM 2.214.104-9	CNPJ 73.667.271/0001-79	RAZÃO SOCIAL PERTECNICA CONSULTORIA E PROJETOS SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA			
ENDEREÇO R CONEGO EUGENIO LETTE 623 CONJ 42		BAIRRO PINHEIROS	CEP 05414-011		
CÓDIGO DE SERVIÇO 01546	DESCRIÇÃO ENG, AGRONOMIA, ARQUIT., URBAN. E CONG.(REG. ESPEC.-SD.)				
TRIMESTRE SEGUNDO	INCIDÊNCIA 06/2014	VENCIMENTO 10/07/2014	VALOR DO ISS POR PROFISSIONAL (R\$) 205,35	UNIDADES TAXADAS 3	VALOR A PAGAR (R\$) 616,05

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1123 55 07 000002354307 3 0  
81630000063 160500005527 014071007000 000235430725

VIA CONTRIBUINTE



**PREFEITURA DE SÃO PAULO**  
FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

## ISS 2014 - SOCIEDADE DE PROFISSIONAIS

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

2º TRIMESTRE

DATA DE VALIDADE  
10/07/2014

CÓDIGO DE SERVIÇO  
01546

INCIDÊNCIA  
06/2014

VALOR DO ISS POR PROFISSIONAL (R\$)  
205,35

CCM  
2.214.104-9

UNIDADES TAXADAS  
3

Data de Vencimento  
10/07/2014

Valor a Pagar (R\$)  
616,05

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1123 55 07 000002354307 3 0  
81630000063 160500005527 014071007000 000235430725

VIA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA





GPS - Guia da Previdência Social

20/08/2014 20:15:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 20.15.14  
6806306806 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PERTECNICA C E P S-C LT  
AGENCIA: 6806-3 CONTA: 608-4  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	07/2014
IDENTIFICADOR	73667271000179
DATA DO PAGAMENTO	20/08/2014
VALOR DO INSS	2.286,93
VALOR OUTRAS ENTIDADES	460,60
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.747,53

=====

DOCUMENTO: 082003  
AUTENTICACAO SISBB: 4.526.757.E40.C6F.917

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 20.15.14  
6806306806 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PERTECNICA C E P S-C LT  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	07/2014
IDENTIFICADOR	73667271000179
DATA DO PAGAMENTO	20/08/2014
VALOR DO INSS	2.286,93
VALOR OUTRAS ENTIDADES	460,60
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.747,53

=====

DOCUMENTO: 082003  
AUTENTICACAO SISBB: 4.526.757.E40.C6F.917

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

Transação efetuada com sucesso por: J1950079 FRANCISCO JOSE JUSTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Emissão de comprovantes

08/09/2014 13:14:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.14.34  
6806306806 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PERTECNICA C E P S-C LT  
AGENCIA: 6806-3 CONTA: 608-4  
=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85R70000005-7 16520179140-5 90757205087-3 36672710001-9
Data do pagamento	05/09/2014
CNPJ/CEI	73667271/0001-79
COMPETENCIA	08/2014
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/09/2014
VALOR DEPOSITO	516,52
Valor Total	516,52

-----  
DOCUMENTO: 090501  
AUTENTICACAO SISBB: 1.C90.D73.E77.9RF.D36

Transação efetuada com sucesso por: J1950079 FRANCISCO JOSE JUSTO.

# FGTS

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 23/08/2014 - 13:26:35



GFIP - SFFIP 8.10

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PERTECNICA HSMA CONSUL PROJ LIMITADA				02-DDD/TELEFONE (0011)30612549
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 6.456,60	06-OTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 73.667.271/0001-79	11-COMPETÊNCIA 08/2014	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 516,52	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 516,52
--	---------------------	-------------------------------

**\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2014\*\***

858700000057 165201791405 907572050873 366727100019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

# FGTS

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 23/08/2014 - 13:26:35

GFIP - SFFIP 8.10

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PERTECNICA HSMA CONSUL PROJ LIMITADA				02 DDD/TELEFONE (0011)30612549
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 6.456,60	06-OTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 73.667.271/0001-79	11-COMPETÊNCIA 08/2014	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 516,52	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 516,52
--	---------------------	-------------------------------

**\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2014\*\***

858700000057 165201791405 907572050873 366727100019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



## Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social



Prezado Cliente PERTECNICA CONS E PROJ SC LTDA - 017366727100017900.

Seu arquivo nzirjo41rth00008.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 23/08/2014 às 13:27.  
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 0A3C7071.28E5429E.984B26A4.9964275D.  
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.  
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

### *Informações Complementares:*

NRA: NZIrjo41rTh00008  
Base de Processamento: SP  
Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP  
Competência: 08/2014

*Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.*

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO  
GRFP - SEFIP 8.40 (22/03/2012)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

DATA: 23/09/2014  
HORA: 13:26:35  
PÁG : 001/001

EMPRESA: PERTECNICA HEMA CONSULT LIMITADA  
COMPTEÑCIA: 09/2014

CÓD REC: 115

INSCRIÇÃO: 73.667.271/0001-79  
SIMPLES: 1

QTD TRABALHADORES	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO	€ 456,60
DEPÓSITO	516,52
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	516,52

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/09/2014

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(O) EMPRESA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO ELO CONECTIVIDADE SOCIAL.



COMPONENTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FIAS  
 EMPRESA

EMPRESA: PETERNICA HSMA CONSUL PR CJ LIMITADA Nº ARQUIVO: NZ1rj041rTH0000-8  
 COMP: 08/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FIAS: 507 OUTRAS ENT: 3079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,00 FAT AJUSTADO: 2,00  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:  
 LOGRADOURO: RUA CONEGO EUGENIO LEITE 623 CONJ 42 BAIRRO: PINHEIROS CNAE PRONDERANTE: 7112000  
 CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 05414-011 TELEFONE: 2011-20612549 CNAE: 7112000  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 507 620 744 779 TOTAL

SEGURADO	EMPREGADOS/AVULSOS	EMPREGADOS/AVULSOS	OUTRAS ENT	ALIQ RAT	FAT AJUSTADO	TOTAL
Empregados/Avulsos	535,45	0,00	0,00	0,00	0,00	535,45
Contribuintes Individuais	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00
EMPRESA						
Empregados/Avulsos	1.291,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.291,32
Contribuintes Individuais	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
RAT	129,13	0,00	0,00	0,00	0,00	129,13
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.234,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.234,90
OUTRAS ENTIDADES	374,43	0,00	0,00	0,00	0,00	374,43
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	374,43	0,00	0,00	0,00	0,00	374,43
TOTAL A RECOLHER	2.609,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.609,38

(\*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.  
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP É DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(S) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/87.  
 O EMPREGADOR/CONTRIBUENTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESERVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.  
 O EMPREGADOR/CONTRIBUENTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EFETUAR DOCUMENTO COMPROVATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTEZAÇÕES POSTERIORES.



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  
 GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 33 0 (14/01/2014)

DATA: 03/03/2014  
 HORA: 13:26:35  
 PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 08/2014

EMPRESA

VALORES: SEGURADOS EMPRESA  
 PERTECNICA HSMA CONSUL PROC LIMITADA

634,45 1.600,45 374,48

EMPRESA		INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	DEB F'AS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO	FPAS
634,45	1.600,45	73.667.272/0001-79	0,00	0,00	2100	507	
			0,00	0,00	2.609,38	0,00	





**Prefeitura do Município de São Paulo**  
Secretaria Municipal de Finanças  
Departamento de Arrecadação e Cobrança

**Declaração Cadastral**

Declaração nº : **1 006328/2014**  
Nome/Razão Social : **PERTECNICA HSMA CONSULTORIA E PROJETOS LIMITADA**  
C.C.M. : **2.214.104-9**

O contribuinte em epígrafe encontra-se enquadrado, para fins do disposto no art. 10 da Lei nº 13.701, de 24 de dezembro de 2003, na condição abaixo indicada:

**Sociedade constituída na forma do parágrafo 1º do artigo 15º da Lei nº 13.701/03.**

Emitida via Internet em : **22/08/2014**

Observações:

Esta declaração possui validade de três meses a contar de sua data de expedição.

**Esta declaração não possui validade como certidão negativa de tributos mobiliários. Certidões on line de tributos mobiliários devem ser requeridas no site "[http://www3.prefeitura.sp.gov.br/certidao/ctm\\_menu.htm](http://www3.prefeitura.sp.gov.br/certidao/ctm_menu.htm)".**

**A autenticidade desta declaração poderá ser confirmada no site da Prefeitura de São Paulo (<http://www.prefeitura.sp.gov.br>).**



 <b>PERTÉCNICA</b> HSMA Consultoria e Projetos Ltda.  Rua Cônego Eugênio Leite, 623 - Cj. 42 CEP 05414-011 - Pinheiros São Paulo - SP Fone (11) 3081.9559 / Fax (11) 3081.8052	<b>NOTA DE DÉBITO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS nº 233</b>	
	CNPJ nº 73.667.271/0001-79	IM nº 2.214.104-9
	Natureza da operação: Prestação de serviços	
	Prestação de serviços: Consultoria e projetos	
	Data da emissão: 12/09/2014	
Vencimento: conf. contr.		

Isento da emissão de Nota Fiscal de acordo com Art. 15, § 3º, da Lei Municipal nº 13.701/03 de 24/12/2.003
Imposto Sobre Serviços de acordo com Art. 10, da Lei Municipal nº 13.701/03 de 24/12/2.003

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO		
<b>Nome:</b> Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Taquaritinga - SAAET		
<b>CNPJ:</b> 45.374.865/0001-56	<b>IE:</b> -	<b>IM:</b> -
<b>Endereço:</b> Rua Clíneu Braga de Magalhães, 911	<b>CEP:</b> 15900-000	
<b>Município:</b> Taquaritinga	<b>Estado:</b> SP	

Deve(m) a PERTÉCNICA HSMA Consultoria e Projetos Ltda., estabelecida no endereço acima, a importância no valor de R\$ 41.618,88 (quarenta e hum mil, seiscentos e dezoito reais e oitenta e oito centavos), pagável na praça de São Paulo.

UNID.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS (R\$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
		Contrato nº 045/2.013 - Gerenciamento de Obras de Saneamento / Esgotos / Estação de Tramento - ETE, na cidade de Taquaritinga - SP. Medição 08 - Serviços prestados no mês 08/2.014  - Retenções RFB: IR (1,5%) = R\$ 624,28 / PIS (0,65%) = R\$ 270,52 / COFINS (3,0%) = R\$ 1.248,57 / CSLL (1,0%) = R\$ 416,19  <u>Dados para depósito:</u> Banco do Brasil (001) Agência nº: 6806-3 / Conta corrente nº: 608-4		41.618,88

<b>NÃO TEM VALOR COMO RECIBO</b>	Valor dos serviços (R\$)	41.618,88
	Total desta nota (R\$)	41.618,88

1ª Via: Destinatário  [X]  
2ª Via: Emitente  [ ]  
3ª Via: Contábil  [ ]



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA  
E ESGOTO DE TAQUARITINGA



Para: Superintendência

Re: Protocolo – PERTÉCNICA HSMA Consultoria e Projetos Ltda. – Tomada de Preços nº 01/2013 – Contrato nº 45/2013 – 8º relatório mensal dos serviços executados e nota fiscal.

Objeto: prestação de serviços técnicos especializados de engenharia no gerenciamento de obras de saneamento / esgotos / Estação de Tratamento – ETE.

Após apreciação dos documentos e relatórios protocolados nesta Autarquia pela empresa PERTÉCNICA, nada temos a opor quanto ao apresentado, bem como ao pagamento da nota de débitos de serviços profissionais nº 233.

À Tesouraria para providências.

Taquaritinga, 12 de setembro de 2.014.

  
**Juliana Tinti Bizari Múcio**  
Chefe da Seção de Redes de Água e Esgoto

  
**Luiz Carlos Antonio José**  
Chefe do Setor Operacional



Protocolo 946 / 2014  
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE TAQUARITINGA  
PERTÉCNICA CONSULTORIA E PROJETOS S/S LTDA  
22/09/2014 14:36:43  
RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO DA SEMANA DE 08 A



DTE-071/14

São Paulo, 19 de Setembro de 2.014.

Ao

**Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Taquaritinga - SAAET**  
Rua Clíneu Braga de Magalhães, 911  
CEP 15900-000 - Centro  
Taquaritinga - SP

At.: Satoshi Yokoyama  
Superintendente

Ref.: Contrato nº 045/2013 - Prestação de serviços técnicos especializados de engenharia no Gerenciamento de Obras de Saneamento / Esgotos / Estação de Tratamento - ETE

Ass.: Relatório de Acompanhamento Semanal / Semanas de 08 a 12/09/2014


Prezados Senhores (as),

Vimos com o presente, encaminhar a V.S.as, para apreciação e considerações, 01 (uma) via impressa e 01 (uma) via em arquivo digital (extensão.pdf), do relatório de acompanhamento semanal das obras da Estação de Tratamento de Esgotos (ETE), objeto do contrato em referência, conforme discriminação a seguir:

- 1) Relatório de Acompanhamento da Semana de 08 a 12/09/2.014, Revisão 0 (N/Ref.: GE-174-RE-AS-032-R0);

Sendo o que nos apresenta para o momento, despedimo-nos.

Atenciosamente,

  
Engº Francisco José Justo  
Sócio Gerente



## SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE TAQUARITINGA

CONTRATO Nº 045/2013 - GERENCIAMENTO DE OBRAS DE SANEAMENTO / ESGOTOS /  
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO - ETE

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO SEMANAL – 08 A 12/09/2014

N/REF.: GE-174-RE-AS-032-R0  
TAQUARITINGA -SP  
SETEMBRO/2014





## APRESENTAÇÃO

Apresenta-se a seguir o Relatório de Acompanhamento Semanal, das atividades previstas no Gerenciamento das Obras da Estação de Tratamento de Esgotos – ETE a ser implantada para o Sistema de Esgotos Sanitários (SES) da cidade de Taquaritinga, em consonância com a Autorização de Serviço de 03/01/21014, para o Contrato nº 045/2013, firmado em 30/12/2013, entre o SAAET - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Taquaritinga e a PERTÉCNICA HSMA Consultoria e Projetos Ltda.

O principal objetivo deste relatório é propiciar ao SAAET, o acompanhamento físico das obras na semana de 08 a 12/09/2014.

**ÍNDICE**

- 1 - DADOS DO EMPREENDIMENTO**
- 2 - ATIVIDADES NA SEMANA DE 08 A 12/09/2014**
- 3 - DOCUMENTÁRIO FOTOGRÁFICO**

**1 - DADOS DO EMPREENDIMENTO**

## 1 - DADOS DO EMPREENDIMENTO

- **Agente Promotor:** Governo do Estado de São Paulo / Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos / Departamento de Águas e Energia Elétrica - DAEE

- **Agente Financeiro e Técnico:** Departamento de Águas Energia Elétrica - DAEE

- **Objeto:** Obras de Implantação de Sistema de Afastamento e Tratamento de Esgotos Sanitários de Taquaritinga (Sede)

- **Recursos:**

- . Fonte: Programa Água Limpa;
- . Convênio nº 2011/33/00335.9, de 29/12/2.011;
- . Valor: R\$ 14.491.618,13 – Exercício 2011;
- . Prazo: 24 meses

- **Agente Executor:** Prefeitura Municipal de Taquaritinga - SP

- **Contrato das obras e serviços:**

- . Processo licitatório: Concorrência nº 011/12;
- . Contrato nº 194/12, de 11/12/2.012;
- . Contratado: KMG Consultoria e Engenharia Ltda.;
- . Valor: R\$ 11.431.936,13;
- . Prazo: 18 meses após Ordem de Serviço;
- . Ordem de Serviço de 17/12/2.012; Término: 18/06/2.014;
- . Aditivo contratual de valor (Termo Aditivo 001/2013): R\$ 2.817.533,01 (24,65%), em 31/12/2.013;
- . Valor contratual aditivado: R\$ 14.249.469,14;
- . Aditivo de prazo contratual (Termo Aditivo 001/201): em 11/06/2.014, prorrogado em 90 (noventa) dias a contar de 18/06/2.014.



## 2 – ATIVIDADES NA SEMANA 08 A 12/09/2014

No período de 08 a 12/09/2014, as atividades da Gerenciadora constaram de:

### 1) Acompanhamento da construção civil das unidades

→ Estação Elevatória Final

- Instalação da haste da talha da unidade.

→ Estação Elevatória Recirculação

- Instalação da haste da talha da unidade.

→ Casa de Desidratação de Lodo

- Execução da calçada de acesso ao painel de comando da unidade.

→ Urbanização

- Execução das bocas de lobo na rua principal da ETE;

- Regularização do talude para plantio de grama;

- Gabarito de guia/ sarjeta;

- Instalação dos fios do poste de energia central para o transformador da ETE.

Obs.: Guarita e Administração estão com a rede elétrica funcionando.

### 2) Acompanhamento das instalações elétricas das unidades

→ Casa de Painel

- Instalação dos cabos da Casa de Painel 2 à Casa de Painel 3.

### 3) Dados Gerais

- Em média a obra contou com 08 operários, trabalhando em 2 turnos, das 7:00 as 12:00h e 13:00 às 17:00h, sendo:

- 04 ajudantes;
- 03 pedreiros;
- 01 encarregados;

- Todos operários estavam com EPI's.


- No período não ocorreram acidentes de trabalho.

- Não foram constatadas chuvas no período.

- Foram terceirizados os seguintes serviços:

- Máquinas e operadores.



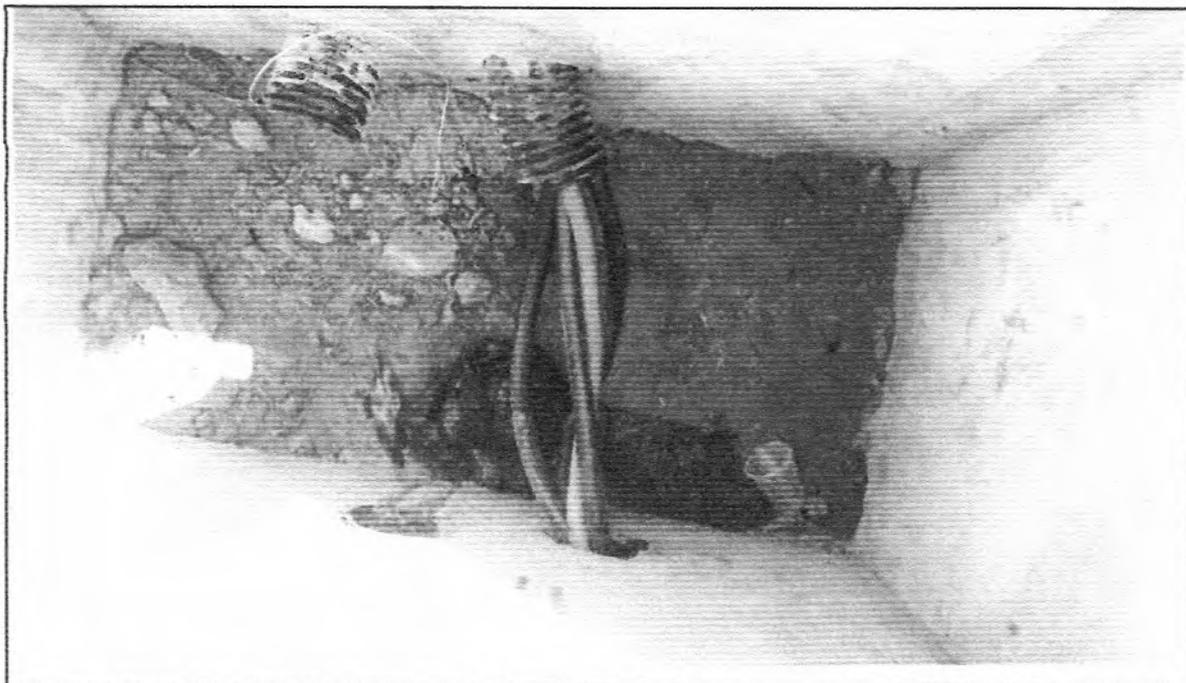

**Descrição:** Instalação dos cabos da Casa de Painei 2 à Casa de Painei 3.

**Foto:** 01

**Data:** 12/09/14

**Arquivo:** 095514




**Descrição:** Execução da boca de lobo na rua principal da ETE.

**Foto:** 02

**Data:** 12/09/14

**Arquivo:** 100815

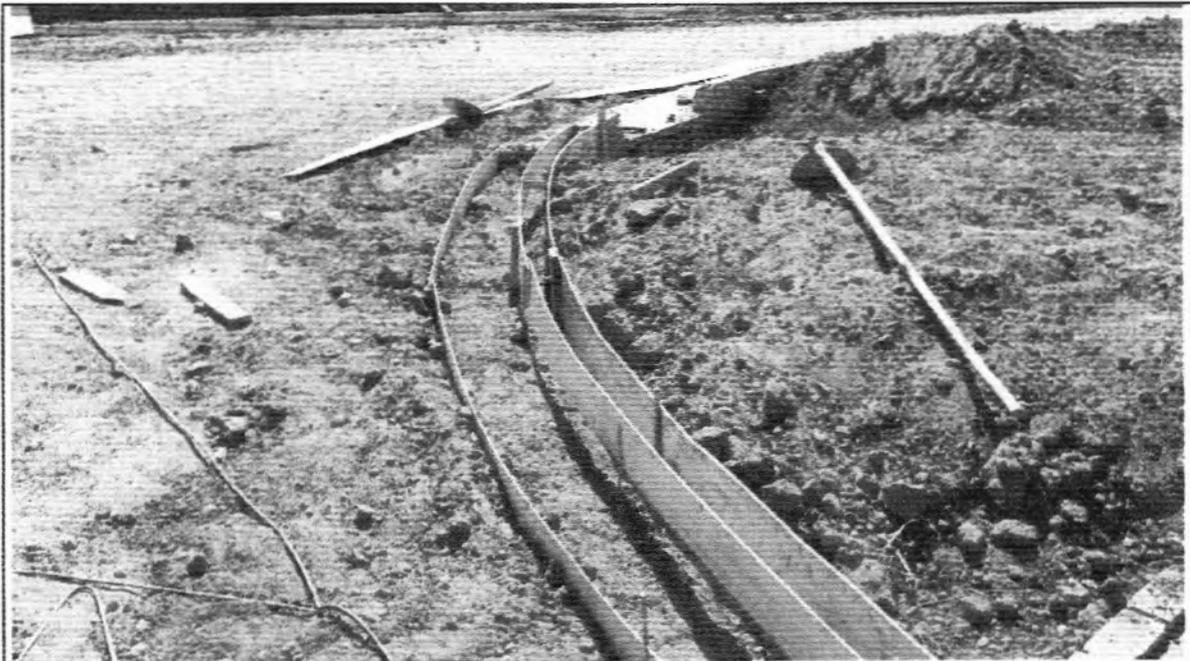


**Descrição:** Gabarito de guia/ sarjeta.

**Foto:** 03

**Data:** 12/09/14

**Arquivo:** 100822

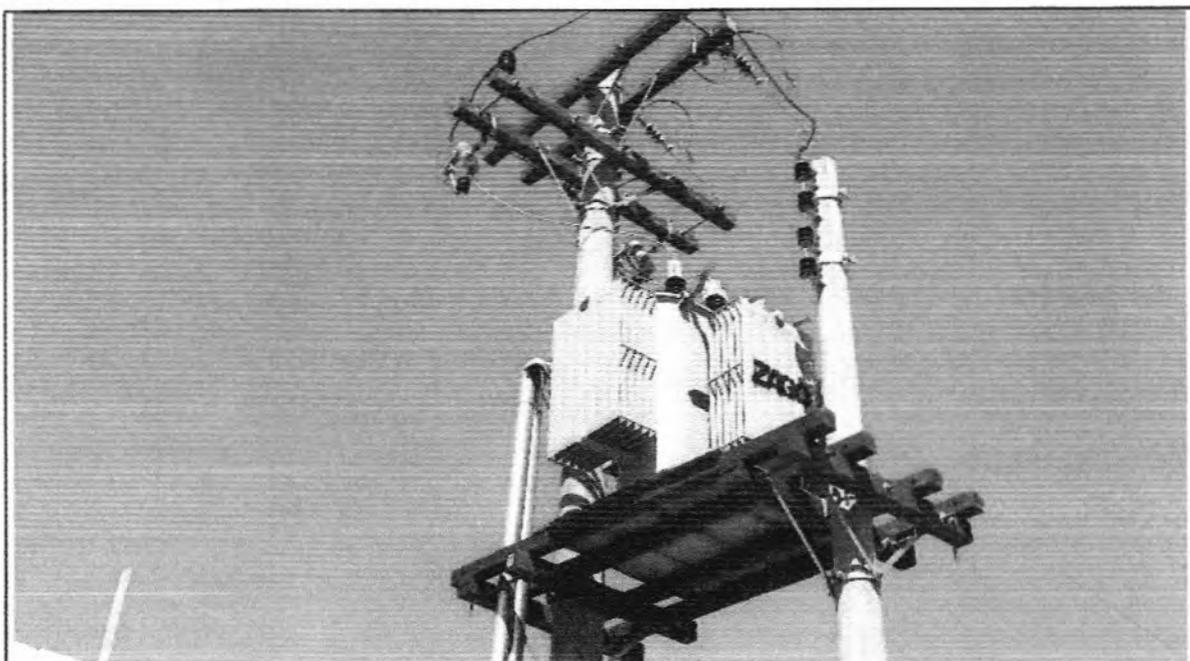

**Descrição:** Instalação dos cabos do poste de energia central para o transformador da ETE.

**Foto:** 04

**Data:** 12/09/14

**Arquivo:** 101419



**Descrição:** Instalação da haste da talha da EE Final.

**Foto:** 05

**Data:** 12/09/14

**Arquivo:** 101650



**Descrição:** Regularização do talude para plantio de grama.

**Foto:** 06

**Data:** 12/09/14

**Arquivo:** 102000



**Descrição:** Instalação da haste da talha da EE Recirculação.

**Foto:** 07

**Data:** 12/09/14

**Arquivo:** 102238



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA  
E ESGOTO DE TAQUARITINGA

CÓPIA



Taquaritinga, 22 de setembro 2014.

**Ofício nº 202/2014**

Prezados Senhores:


O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Taquaritinga – SAAET, por seu Superintendente infra-assinado, vem através deste, encaminhar, em anexo, as cópias das seguintes documentações:

- Solicitação de Aditivo do contrato 194/12, protocolado junto a Prefeitura Municipal de Taquaritinga, pela empresa KMG Consultoria e Engenharia Ltda.

- Termo Aditivo celebrado entre a empresa KMG CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA e a PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA, no dia 15/09/2014 .

Sendo estas as informações necessárias, e sem mais para o momento, prevalecemo-nos da oportunidade para renovar protestos de alta estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

  
**Satoshi Yokoyama**  
Superintendente

À  
Pertécnica HSMA Consultoria e Projetos Ltda.  
Rua Cônego Eugênio Leite, nº 623 – Cj. 42  
Pinheiros - SP  
CEP: 05414-011

**COPIA**

C. KMG-94/2014

São Paulo, 10 de Setembro de 2014.

**A****Prefeitura Municipal de Taquaritinga**Praca Dr. Horacio Ramalho, 160Centro - Taquaritinga - São Paulo**At. Dr. Fulvio Zuppani - Prefeito Municipal****Ref.: Contrato Nº 194/12****Ass.: Implantação de Sistema de Afastamento e Tratamento de Esgotos Sanitários**

Prezados Senhores,

Devido ao atraso da Eletropaulo na ligação de energia da ETE, o que ocasionou um atraso na execução dos serviços, solicitamos aditamento de prazo por mais 90 dias.

Atenciosamente,

**Enga. Gabriela de Figuelredo Laurelli****Diretora**

Conc. 001/12 fls. 3342  
Licitação 7

PROTÓCOLO  
RUBRICA FOLHA  
02




SAAET  
16/16  
TAQUARITINGA

VISTA

Abro vista deste processo à (ao)  
Prefeito em 12/09/2014.  
Eu, [Signature]  
(LUANA F. P. DA SILVA) digitei e assino.  
Protocolo/Arquivo

Arquivo  
12/19/14



do Engº Paulo Peretti

Para análise do Engº Paulo Peretti em fls. 02

12/09/14  
[Signature]

Luiz Vieira do Carmo Neto  
Arquiteto-Urbanista  
CAUIER A 82406  
Secretário Municipal - SUCOP  
Secretaria de Meio e Obras Públicas



# Prefeitura Municipal de Taquaritinga

ESTADO DE SÃO PAULO




## TERMO ADITIVO 002/14 AO TERMO DE CONTRATO Nº 194/12.


Pelo presente termo e pela melhor forma de direito, de um lado, como CONTRATANTE a **PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA**, pessoa jurídica de direito público interno, sediada à Praça Dr. Horácio Ramalho, 160, Centro, inscrita no CNPJ nº 72.130.818/0001-30, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, **Dr. FULVIO ZUPPANI**, portador do RG 4.639.473-4 e CPF 746.848.338-87, domiciliado à Rua 7 de Setembro, nº 335, na cidade de Taquaritinga, estado de São Paulo, de outro lado, como CONTRATADA a empresa **KMG CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA**, com sede à Avenida Rouxinol, 55 – Conj. 406/407 Moema, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob nº 08.250.097/0001-00, neste ato representada na forma de seu estatuto por sua Sócia-Administradora e Responsável Técnico, **Sra. GABRIELA DE FIGUEIREDO LAURELLI**, brasileira, casada, engenheira civil, portadora do RG nº 18.715.255-X SSP/SP e CPF nº 164.199.458-44, domiciliada à Av. Padre Antonio José dos Santos, 233 – Apto. 141, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.


Tendo celebrado em 11/12/2013, o Termo de Contrato nº 194/12, oriundo da Concorrência 001/12, relativo às obras de implantação de Sistema de Afastamento e Tratamento de Esgotos Sanitários, no Município de Taquaritinga, Estado de São Paulo, resolvem de comum acordo prorrogar por 90 dias o prazo de vigência do contrato á contar de 16/09/2014, permanecendo inalteradas as demais condições estabelecidas e que ora são ratificadas”.

E por estarem assim justos e combinados, assinam o presente Termo em duas vias, para os devidos efeitos legais, na presença de duas testemunhas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA, 15 de setembro de 2014.

  
Fulvio Zuppani  
Prefeito Municipal

  
Gabriela de Figueiredo Laurelli  
KMG Consultoria e Engenharia Ltda

TESTEMUNHAS:   
Jenifer Carla da Silva  
RG 46.637.999-7  
CPF 388.939.298-99

  
Cristiane Poironieri Rombalde  
RG 34.198.317-23  
CPF 297.336.278-44



# Prefeitura Municipal de Taquaritinga

ESTADO DE SÃO PAULO



## PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA

Termo Aditivo nº 002/14 ao Termo de Contrato nº 194/12 - CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Taquaritinga – CONTRATADA: KMG Consultoria e Engenharia Ltda – OBJETO: obras de implantação de Sistema de Afastamento e Tratamento de Esgotos Sanitários, no Município de Taquaritinga, Estado de São Paulo, resolvem, de comum acordo, prorrogar por 90 dias o prazo de vigência do contrato, a contar de 16/09/2014 – ASSINATURA: 15/09/14 – MODALIDADE: Concorrência nº 001/12.

Dr. Fulvio Zuppani  
Prefeito Municipal





PREENCHER COM LETRA DE FORMA

**AR**

DESTINATÁRIO DO OBJETO / DESTINATAIRE			
NOME OU RAZÃO SOCIAL DO DESTINATÁRIO DO OBJETO / NOM OU RAISON SOCIALE DU DESTINATAIRE			
PERTECNI CA H.S.M.A. CONSULTORIA PROJETOS LTDA			
ENDEREÇO / ADRESSE			
R. Cônego Eugênio Leite N: 623 CS 42			
CEP / CODE POSTAL	CIDADE / LOCALITÉ	UF	PAIS / PAYS
05419-011	PINHÉIROS	SP	BRASIL
DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO (SUJEITO À VERIFICAÇÃO) / DISCRIMINATION		NATUREZA DO ENVIO / NATURE DE L'ENVOI	
Ofício 202/14 - envio de cópia de documentação (Solicitação de termo Aditivo - King / P.M.P.)		<input type="checkbox"/> PRIORITÁRIA / PRIORITAIRE	
		<input type="checkbox"/> EMS	
		<input type="checkbox"/> SEGURADO / VALEUR DÉCLARÉ	
ASSINATURA DO RECEBEDOR / SIGNATURE DU RECEPTEUR		DATA DE RECEBIMENTO / DATE DE LIVRAISON	CARIMBO DE ENTREGA / UNIDADE DE DESTINO / BUREAU DE DESTINATION
<i>Josefa Cantalant Ramos</i>		24/9/14	24 SET 2014
NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR / NOM LISIBLE DU RECEPTEUR			
Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR / ORGÃO EXPEDIDOR	RUBRICA DO EMPREGADO / SIGNATURE		
	<del>Julio Cesar Martins Alves Matr. 8.898.216-5 Carteiro</del>		
ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO NO VERSO / ADRESSE DE RETOUR DANS LE VERSO			

75240203-0

FC0463 / 16

114 x 180 mm



DTE-072/14

São Paulo, 26 de Setembro de 2.014.

Ao

**Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Taquaritinga - SAAET**

Rua Clineu Braga de Magalhães, 911

CEP 15900-000 - Centro

Taquaritinga - SP

At.: Satoshi Yokoyama  
Superintendente

Ref.: Contrato nº 045/2013 - Prestação de serviços técnicos especializados de engenharia no Gerenciamento de Obras de Saneamento / Esgotos / Estação de Tratamento - ETE

Ass.: Relatório de Acompanhamento Semanal / Semana de 15 a 19/09/2014


Prezados Senhores (as),

Vimos com o presente, encaminhar a V.S.as, para apreciação e considerações, 01 (uma) via impressa e 01 (uma) via em arquivo digital (extensão.pdf), do relatório de acompanhamento semanal das obras da Estação de Tratamento de Esgotos (ETE), objeto do contrato em referência, conforme discriminação a seguir:

- 1) Relatório de Acompanhamento da Semana de 15 a 19/09/2.014, Revisão 0 (N/Ref.: GE-174-RE-AS-033-R0);

Sendo o que nos apresenta para o momento, despedimo-nos.

Atenciosamente,



Engº Francisco José Justo  
Sócio Gerente



## SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE TAQUARITINGA

CONTRATO Nº 045/2013 - GERENCIAMENTO DE OBRAS DE SANEAMENTO / ESGOTOS /  
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO - ETE

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO SEMANAL – 15 A 19/09/2014

N/REF.: GE-174-RE-AS-033-R0  
TAQUARITINGA -SP  
SETEMBRO/2014



## APRESENTAÇÃO

Apresenta-se a seguir o Relatório de Acompanhamento Semanal, das atividades previstas no Gerenciamento das Obras da Estação de Tratamento de Esgotos – ETE a ser implantada para o Sistema de Esgotos Sanitários (SES) da cidade de Taquaritinga, em consonância com a Autorização de Serviço de 03/01/21014, para o Contrato nº 045/2013, firmado em 30/12/2013, entre o SAAET - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Taquaritinga e a PERTÉCNICA HSMA Consultoria e Projetos Ltda.

O principal objetivo deste relatório é propiciar ao SAAET, o acompanhamento físico das obras na semana de 15 a 19/09/2014.

**ÍNDICE**

- 1 - DADOS DO EMPREENDIMENTO**
- 2 - ATIVIDADES NA SEMANA DE 15 A 19/09/2014**
- 3 - DOCUMENTÁRIO FOTOGRÁFICO**

**1 - DADOS DO EMPREENDIMENTO**

## 1 - DADOS DO EMPREENDIMENTO

- **Agente Promotor:** Governo do Estado de São Paulo / Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos / Departamento de Águas e Energia Elétrica - DAEE

- **Agente Financeiro e Técnico:** Departamento de Águas Energia Elétrica - DAEE

- **Objeto:** Obras de Implantação de Sistema de Afastamento e Tratamento de Esgotos Sanitários de Taquaritinga (Sede)

### - Recursos:

- . Fonte: Programa Água Limpa;
- . Convênio nº 2011/33/00335.9, de 29/12/2.011;
- . Valor: R\$ 14.491.618,13 – Exercício 2011;
- . Prazo: 24 meses

- **Agente Executor:** Prefeitura Municipal de Taquaritinga - SP

### - Contrato das obras e serviços:

- . Processo licitatório: Concorrência nº 011/12;
- . Contrato nº 194/12, de 11/12/2.012;
- . Contratado: KMG Consultoria e Engenharia Ltda.;
- . Valor: R\$ 11.431.936,13;
- . Prazo: 18 meses após Ordem de Serviço;
- . Ordem de Serviço de 17/12/2.012; Término: 18/06/2.014;
- . Aditivo contratual de valor (Termo Aditivo 001/2013): R\$ 2.817.533,01 (24,65%), em 31/12/2.013;
- . Valor contratual aditivado: R\$ 14.249.469,14;
- . Aditivo de prazo contratual (Termo Aditivo 001/201): em 11/06/2.014, prorrogado em 90 (noventa) dias a contar de 18/06/2.014.

**2 – ATIVIDADES NA SEMANA DE 15 A 19/09/2014**

## 2 – ATIVIDADES NA SEMANA 15 A 19/09/2014

No período de 15 a 19/09/2014, as atividades da Gerenciadora constaram de:

### 1) Acompanhamento da construção civil das unidades

→ Desarenador

- Reaterro do talude da unidade.

→ Reatores

- Execução das escadas de acesso das lajes dos Reatores 1 e 2.

→ Casa Desidratação de Lodo

- Execução da escada e calçada de acesso ao painel de controle da unidade.

→ Tanque de Contato

- Regularização do talude para plantio de grama;
- Limpeza da canaleta de águas pluviais.

→ Urbanização

- Reparos de guia/ sarjeta;
- Plantio de grama no talude do Tanque de Contato.

### 2) Acompanhamento das instalações elétricas das unidades

→ Casa de Painel

- Instalação dos cabos da Casa de Painel 3 à Válvula tipo Guilhotina da Caixa de Manobra 1.

### 3) Dados Gerais

- Em média a obra contou com 08 operários, trabalhando em 2 turnos, das 7:00 as 12:00h e 13:00 às 17:00h, sendo:

- 03 ajudantes;
- 03 pedreiros;
- 01 encarregados;
- 01 eng. elétrico

- Todos operários estavam com EPI's.

- No período não ocorreram acidentes de trabalho.

- Não foram constatadas chuvas no período.






**Descrição:** Reaterro do talude do Desarenador.

**Foto:** 01

**Data:** 22/09/14

**Arquivo:** 103330

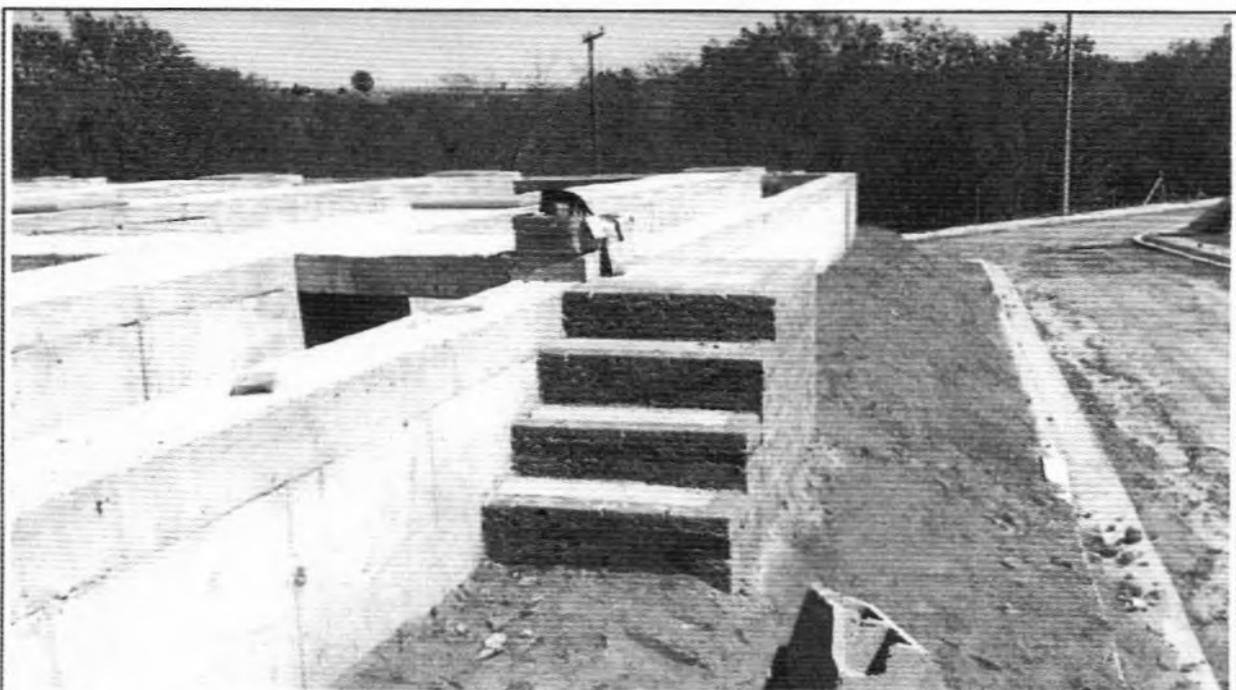

**Descrição:** Execução da escada de acesso da laje do Reator 1

**Foto:** 02

**Data:** 22/09/14

**Arquivo:** 103442



**Descrição:** Execução da escada de acesso da laje do Reator 2.

**Foto:** 03

**Data:** 22/09/14

**Arquivo:** 103502



**Descrição:** Reparos de guia/ sarjeta

**Foto:** 04

**Data:** 22/09/14

**Arquivo:** 103607



**Descrição:** Regularização do talude e plantio de grama no entorno do Tanque de Contato

**Foto:** 05

**Data:** 22/09/14

**Arquivo:** 103923



**Descrição:** Instalação dos cabos da Casa de Painel 3 à Válvula tipo Guilhotina da Caixa de Manobra 1.

**Foto:** 06

**Data:** 22/09/14

**Arquivo:** 104524



**Descrição:** Execução da escada e calçada de acesso ao painel de controle da Casa Desidratação de Lodo.

**Foto:** 07

**Data:** 22/09/14

**Arquivo:** 110553

DTE-075/14  
São Paulo, 03 de Outubro de 2.014.

Ao

**Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Taquaritinga - SAAET**

Rua Clineu Braga de Magalhães, 9<sup>º</sup>

CEP 15900-000 - Centro

Taquaritinga - SP

Protocolo 973 / 2014

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE TAQUARITINGA  
PERTÉCNICA CONSULTORIA E PROJETOS S/S LTDA

03/10/2014

15:10:29

\*RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO SEMANAL 22 A 26/09/2014

At.: Satoshi Yokoyama  
Superintendente

Ref.: Contrato nº 045/2013 - Prestação de serviços técnicos especializados de engenharia no Gerenciamento de Obras de Saneamento / Esgotos / Estação de Tratamento - ETE

Ass.: Relatório de Acompanhamento Semanal / Semana de 22 a 26/09/2014


Prezados Senhores (as),

Vimos com o presente, encaminhar a V.S.as, para apreciação e considerações, 01 (uma) via impressa e 01 (uma) via em arquivo digital (extensão.pdf), do relatório de acompanhamento semanal das obras da Estação de Tratamento de Esgotos (ETE), objeto do contrato em referência, conforme discriminação a seguir:

- 1) Relatório de Acompanhamento da Semana de 22 a 26/09/2.014, Revisão 0 (N/Ref.: GE-174-RE-AS-034-R0);

Sendo o que nos apresenta para o momento, despedimo-nos.

Atenciosamente,



Engº Francisco José Justo  
Sócio Gerente



## SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE TAQUARITINGA

**CONTRATO Nº 045/2013 - GERENCIAMENTO DE OBRAS DE SANEAMENTO / ESGOTOS /  
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO - ETE**

**RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO SEMANAL – 22 A 26/09/2014**

**N/REF.: GE-174-RE-AS-034-R0  
TAQUARITINGA -SP  
SETEMBRO/2014**

  
**PERTÉCNICA**



## APRESENTAÇÃO

Apresenta-se a seguir o Relatório de Acompanhamento Semanal, das atividades previstas no Gerenciamento das Obras da Estação de Tratamento de Esgotos – ETE a ser implantada para o Sistema de Esgotos Sanitários (SES) da cidade de Taquaritinga, em consonância com a Autorização de Serviço de 03/01/21014, para o Contrato nº 045/2013, firmado em 30/12/2013, entre o SAAET - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Taquaritinga e a PERTÉCNICA HSMA Consultoria e Projetos Ltda.

O principal objetivo deste relatório é propiciar ao SAAET, o acompanhamento físico das obras na semana de 22 a 26/09/2014.

**ÍNDICE**

- 1 - DADOS DO EMPREENDIMENTO**
- 2 - ATIVIDADES NA SEMANA DE 22 A 26/09/2014**
- 3 - DOCUMENTÁRIO FOTOGRÁFICO**

1 - DADOS DO EMPREENDIMENTO

## 1 - DADOS DO EMPREENDIMENTO

- **Agente Promotor:** Governo do Estado de São Paulo / Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos / Departamento de Águas e Energia Elétrica - DAEE

- **Agente Financeiro e Técnico:** Departamento de Águas Energia Elétrica - DAEE

- **Objeto:** Obras de Implantação de Sistema de Afastamento e Tratamento de Esgotos Sanitários de Taquaritinga (Sede)

- **Recursos:**

- . Fonte: Programa Água Limpa;
- . Convênio nº 2011/33/00335.9, de 29/12/2.011;
- . Valor: R\$ 14.491.618,13 – Exercício 2011;
- . Prazo: 24 meses

- **Agente Executor:** Prefeitura Municipal de Taquaritinga - SP

- **Contrato das obras e serviços:**

- . Processo licitatório: Concorrência nº 011/12;
- . Contrato nº 194/12, de 11/12/2.012;
- . Contratado: KMG Consultoria e Engenharia Ltda.;
- . Valor: R\$ 11.431.936,13;
- . Prazo: 18 meses após Ordem de Serviço;
- . Ordem de Serviço de 17/12/2.012; Término: 18/06/2.014;
- . Aditivo contratual de valor (Termo Aditivo 001/2013): R\$ 2.817.533,01 (24,65%), em 31/12/2.013;
- . Valor contratual aditivado: R\$ 14.249.469,14;
- . Aditivo de prazo contratual (Termo Aditivo 001/201): em 11/06/2.014, prorrogado em 90 (noventa) dias a contar de 18/06/2.014.



## 2 – ATIVIDADES NA SEMANA 22 A 26/09/2014

No período de 22 a 26/09/2014, as atividades da Gerenciadora constaram de:

### 1) Acompanhamento da construção civil das unidades

#### →Desarenador

- Reboco da escada da unidade.

#### →Reatores

- Reboco da escada do Reator 1.

#### →Caixa de Fluxo

- Montagem de armadura e forma da escada da Caixa de Fluxo 1;
- Concretagem da escada da Caixa de Fluxo 1;
- Montagem de armadura e forma dos pilares da escada da Caixa de Fluxo 2;
- Concretagem dos pilares da escada da Caixa de Fluxo 2.

#### →Urbanização

- Reparos de guia/ sarjeta;
- Concretagem da calçada na rua principal da ETE.

### 2) Acompanhamento das instalações elétricas das unidades

#### →Casa Desidratação de Lodo

- Instalação do painel de comando da unidade.

### 3) Dados Gerais

- Em média a obra contou com 10 operários, trabalhando em 2 turnos, das 7:00 as 12:00h e 13:00 às 17:00h, sendo:

- 04 ajudantes;
- 03 pedreiros;
- 01 encarregados;
- 01 eng. Elétrico
- 01 técnico de segurança

- Todos operários estavam com EPI's.

- No período não ocorreram acidentes de trabalho.

- Não foram constatadas chuvas no período.

- Foram terceirizados os seguintes serviços:

- Caminhão betoneira e operador;





**Descrição:** Instalação do painel de comando da Casa Desidratação de Lodo.

**Foto:** 01

**Data:** 26/09/14

**Arquivo:** 101336



**Descrição:** Reparos de guia/ sarjeta.

**Foto:** 02

**Data:** 26/09/14

**Arquivo:** 101525



**Descrição:** Concretagem da calçada na rua principal da ETE.

**Foto:** 03

**Data:** 26/09/14

**Arquivo:** 101601



**Descrição:** Montagem de armadura e forma dos pilares da escada da Caixa de Fluxo 2.

**Foto:** 04

**Data:** 26/09/14

**Arquivo:** 101752



**Descrição:** Reboco da escada do Reator 1.

**Foto:** 05

**Data:** 26/09/14

**Arquivo:** 102101




**Descrição:** Concretagem da escada da Caixa de Fluxo 1

**Foto:** 06

**Data:** 26/09/14

**Arquivo:** 102130

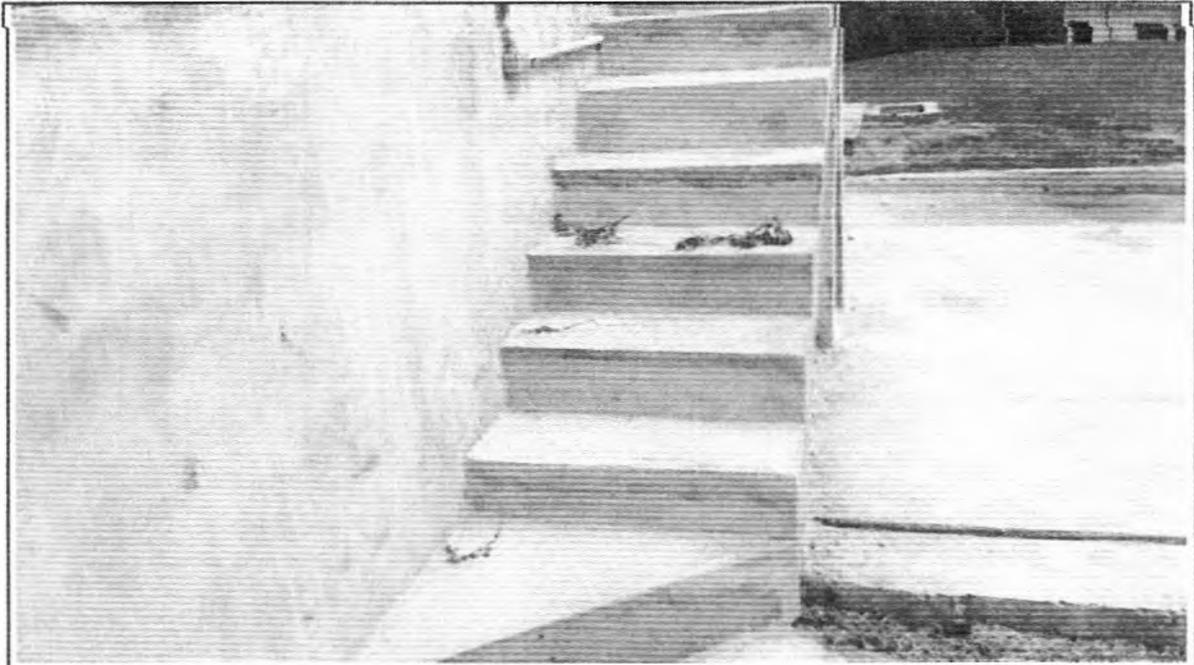

**Descrição:** Reboco da escada do Desarenador.

**Foto:** 07

**Data:** 26/09/14

**Arquivo:** 102214

5

Protocolo 998 / 2014

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE TAQUARITINGA  
PERTÉCNICA CONSULTORIA E PROJETOS S/S LTDA

10/10/2014

13:16:04

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO SEMANAL DE 29/09/ A



DTE-077/14

São Paulo, 10 de Outubro de 2.014.

Ao

**Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Taquaritinga - SAAET**

Rua Clineu Braga de Magalhães, 911

CEP 15900-000 - Centro

Taquaritinga - SP

At.: Satoshi Yokoyama  
Superintendente

Ref.: Contrato nº 045/2013 - Prestação de serviços técnicos especializados de engenharia no Gerenciamento de Obras de Saneamento / Esgotos / Estação de Tratamento - ETE

Ass.: Relatório de Acompanhamento Semanal / Semana de 29/09 a 03/10/2014


Prezados Senhores (as),

Vimos com o presente, encaminhar a V.S.as, para apreciação e considerações, 01 (uma) via impressa e 01 (uma) via em arquivo digital (extensão.pdf), do relatório de acompanhamento semanal das obras da Estação de Tratamento de Esgotos (ETE), objeto do contrato em referência, conforme discriminação a seguir:

- 1) Relatório de Acompanhamento da Semana de 29/09 a 03/10/2.014, Revisão 0 (N/Ref.: GE-174-RE-AS-035-R0).

Sendo o que nos apresenta para o momento, despedimo-nos.

Atenciosamente,

  
Engº Francisco José Justo  
Sócio Gerente



## SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE TAQUARITINGA

**CONTRATO Nº 045/2013 - GERENCIAMENTO DE OBRAS DE SANEAMENTO / ESGOTOS /  
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO - ETE**

**RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO SEMANAL – 29/09 A 03/10/2014**

**N/REF.: GE-174-RE-AS-035-R0  
TAQUARITINGA -SP  
OUTUBRO/2014**



## APRESENTAÇÃO

Apresenta-se a seguir o Relatório de Acompanhamento Semanal, das atividades previstas no Gerenciamento das Obras da Estação de Tratamento de Esgotos – ETE a ser implantada para o Sistema de Esgotos Sanitários (SES) da cidade de Taquaritinga, em consonância com a Autorização de Serviço de 03/01/21014, para o Contrato nº 045/2013, firmado em 30/12/2013, entre o SAAET - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Taquaritinga e a PERTÉCNICA HSMA Consultoria e Projetos Ltda.

O principal objetivo deste relatório é propiciar ao SAAET, o acompanhamento físico das obras na semana de 29/09 a 03/10/2014.

ÍNDICE

- 1 - DADOS DO EMPREENDIMENTO
- 2 - ATIVIDADES NA SEMANA DE 29/09 A 03/10/2014
- 3 - DOCUMENTÁRIO FOTOGRÁFICO

**1 - DADOS DO EMPREENDIMENTO**

## 1 - DADOS DO EMPREENDIMENTO

- **Agente Promotor:** Governo do Estado de São Paulo / Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos / Departamento de Águas e Energia Elétrica - DAEE
- **Agente Financeiro e Técnico:** Departamento de Águas Energia Elétrica - DAEE
- **Objeto:** Obras de Implantação de Sistema de Afastamento e Tratamento de Esgotos Sanitários de Taquaritinga (Sede)
- **Recursos:**
  - . Fonte: Programa Água Limpa;
  - . Convênio nº 2011/33/00335.9, de 29/12/2.011;
  - . Valor: R\$ 14.491.618,13 – Exercício 2011;
  - . Prazo: 24 meses
- **Agente Executor:** Prefeitura Municipal de Taquaritinga - SP
- **Contrato das obras e serviços:**
  - . Processo licitatório: Concorrência nº 011/12;
  - . Contrato nº 194/12, de 11/12/2.012;
  - . Contratado: KMG Consultoria e Engenharia Ltda.;
  - . Valor: R\$ 11.431.936,13;
  - . Prazo: 18 meses após Ordem de Serviço;
  - . Ordem de Serviço de 17/12/2.012; Término: 18/06/2.014;
  - . Aditivo contratual de valor (Termo Aditivo 001/2013): R\$ 2.817.533,01 (24,65%), em 31/12/2.013;
  - . Valor contratual aditivado: R\$ 14.249.469,14;
  - . Aditivo de prazo contratual (Termo Aditivo 001/201): em 11/06/2.014, prorrogado em 90 (noventa) dias a contar de 18/06/2.014.



## 2 – ATIVIDADES NA SEMANA 29/09 A 03/10/2014

No período de 29/09 a 03/10/2014, as atividades da Gerenciadora constaram de:

### 1) Acompanhamento da construção civil das unidades

→ Estação Elevatória Final

- Instalação do guarda corpo da unidade.

→ Reatores

- Reboco da escada do Reator 2.

→ Filtros Biológicos

- Instalação dos guarda corpos dos Filtros 1 e 2.

→ Caixa de Fluxo

- Reboco da escada da Caixa de Fluxo 1;
- Montagem de armadura e forma da escada da Caixa de Fluxo 2;

### 2) Acompanhamento da instalação hidráulico – mecânica das unidades

→ Estação Elevatória Final

- Assentamento da tubulação da caixa de entrada de efluente para EE Final (F°F° - Ø800mm - L= 2,00m).

→ Estação Elevatória de Lodo

- Término da montagem do barrilete da unidade;
- Assentamento da tubulação da EE de Lodo para o Decanter (F°F° - Ø80mm - L= 8,50m).

### 3) Acompanhamento das instalações elétricas das unidades

→ Casa Desidratação de Lodo

- Instalação do painel de comando da unidade.

### 4) Dados Gerais

- Em média a obra contou com 19 operários, trabalhando em 2 turnos, das 7:00 as 12:00h e 13:00 às 17:00h, sendo:

- 08 ajudantes;
- 04 pedreiros;
- 03 encarregados;
- 01 administração;
- 01 eng. Civil;
- 01 técnico de segurança.

- Todos operários estavam com EPI's.

- No período não ocorreram acidentes de trabalho.

- Não foram constatadas chuvas no período.



- Foram terceirizados os seguintes serviços:

- Retroescavadeira e operador;



3 – DOCUMENTÁRIO FOTOGRÁFICO




**Descrição:** Assentamento da tubulação da caixa de entrada de efluente para EE Final.

**Foto:** 01

**Data:** 03/10/14

**Arquivo:** 103355

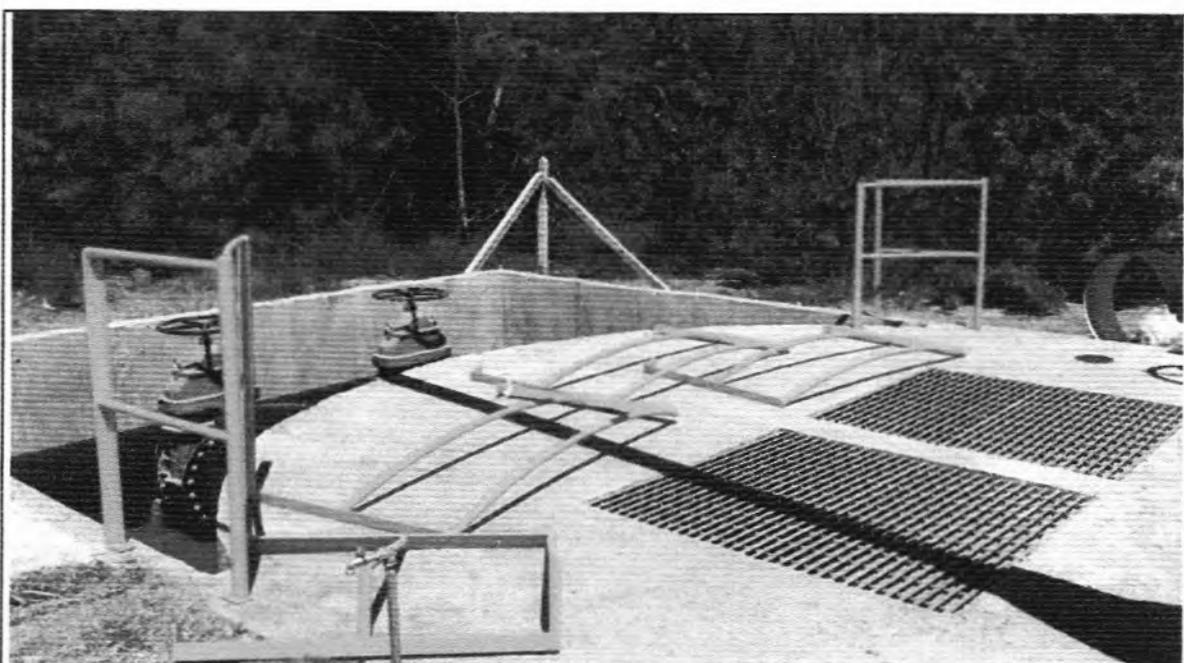


**Descrição:** Instalação do guarda corpo da EE Final.

**Foto:** 02

**Data:** 03/10/14

**Arquivo:** 103543

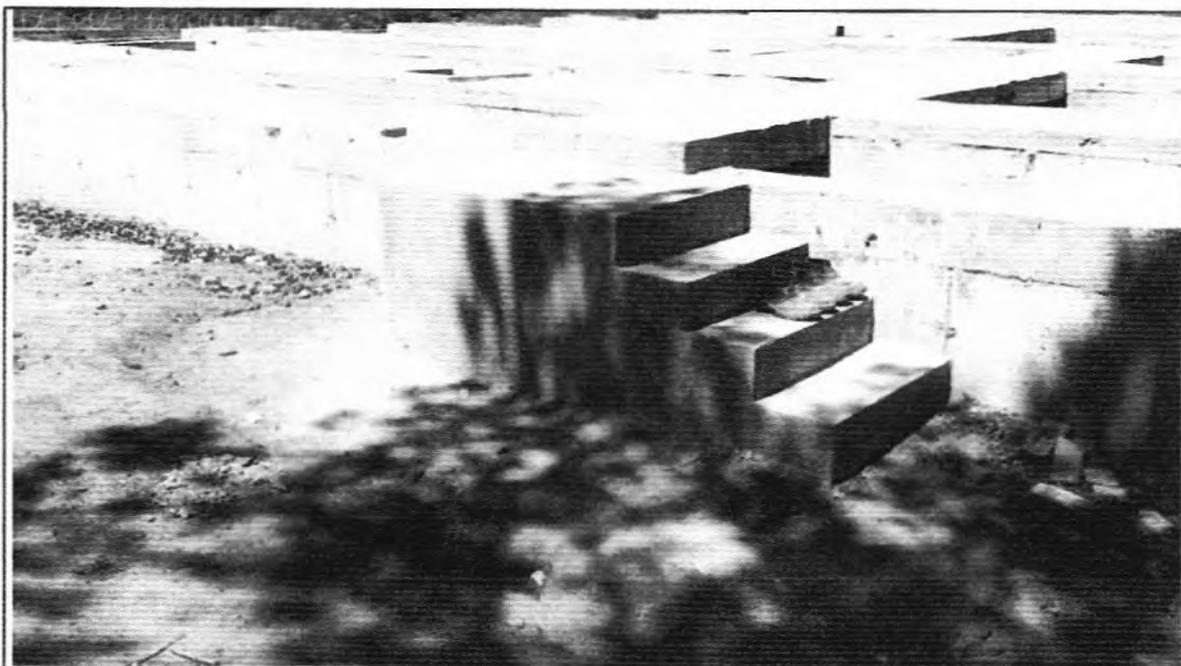

**Descrição:** Reboco da escada do Reator 2.

**Foto:** 03

**Data:** 03/10/14

**Arquivo:** 104055



**Descrição:** Reboco da escada da Caixa de Fluxo 1.

**Foto:** 04

**Data:** 03/10/14

**Arquivo:** 104127




**Descrição:** Instalação do guarda corpo do Filtro 1.

**Foto:** 05

**Data:** 03/10/14

**Arquivo:** 104442

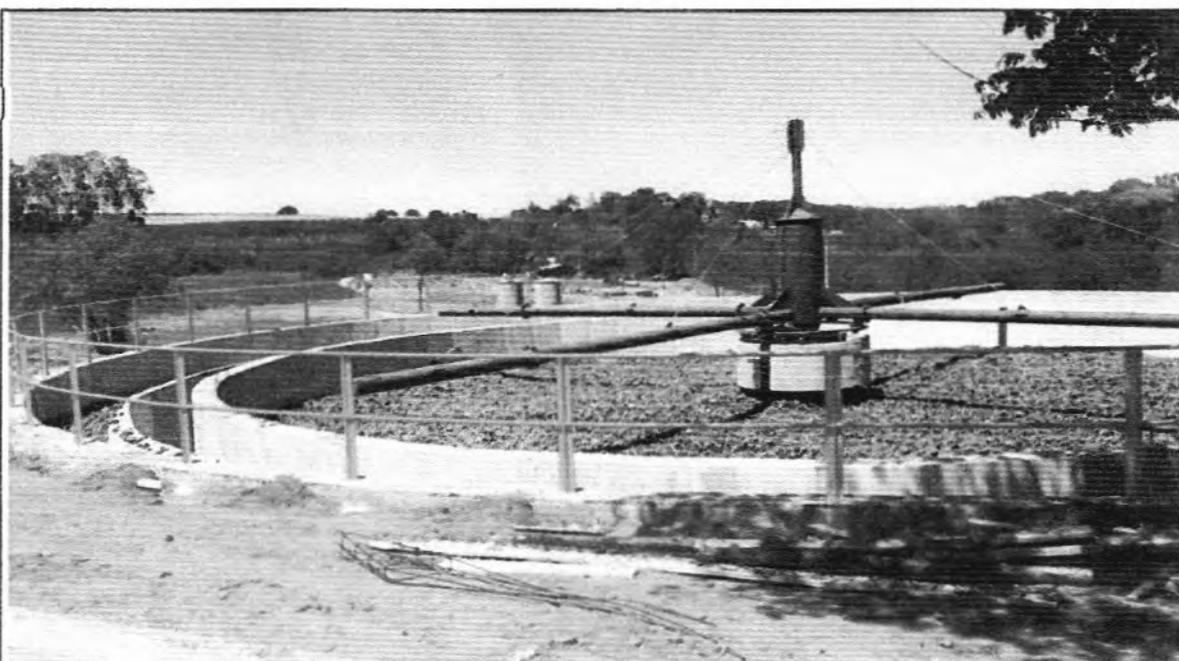


**Descrição:** Instalação do guarda corpo do Filtro 2.

**Foto:** 06

**Data:** 03/10/14

**Arquivo:** 104534

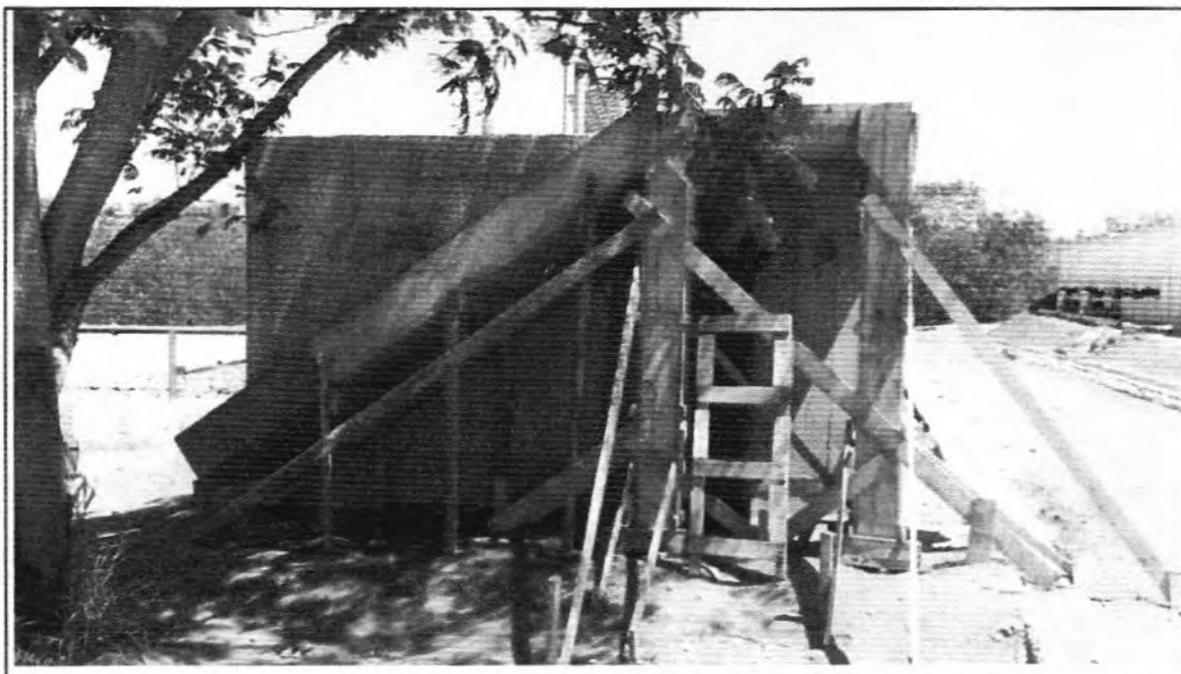


**Descrição:** Montagem de armadura e forma da escada da Caixa de Fluxo 2.

**Foto:** 07

**Data:** 03/10/14

**Arquivo:** 104548

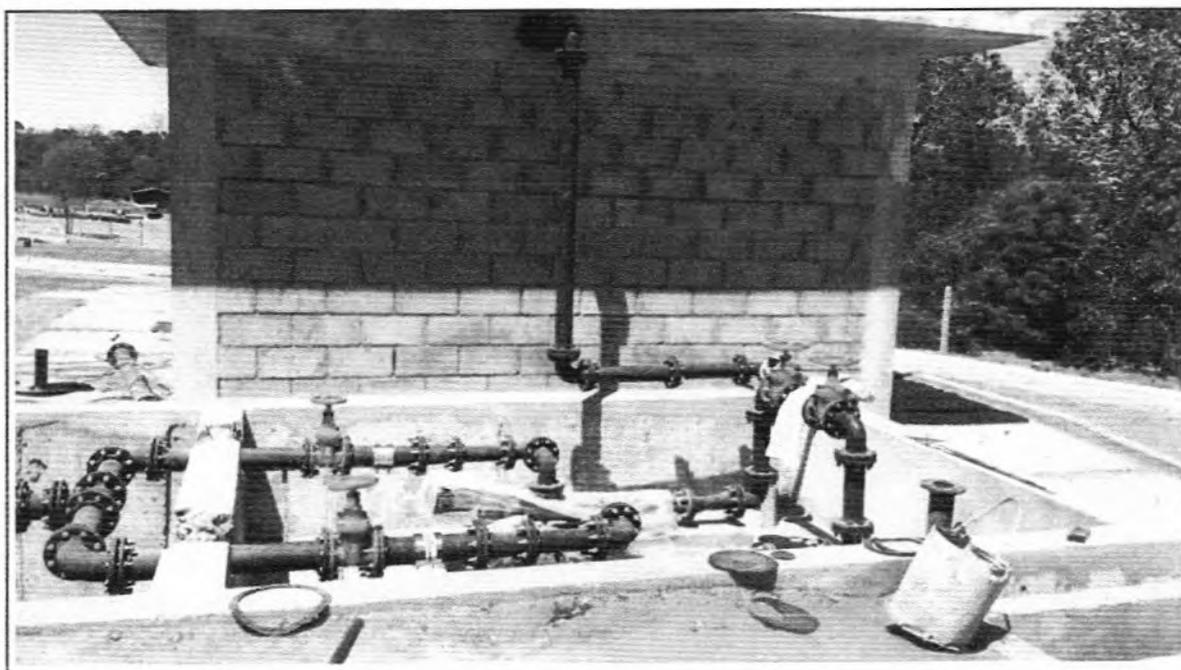


**Descrição:** Término da montagem do barrilete da EE de Lodo.

**Foto:** 08

**Data:** 03/10/14

**Arquivo:** 104751

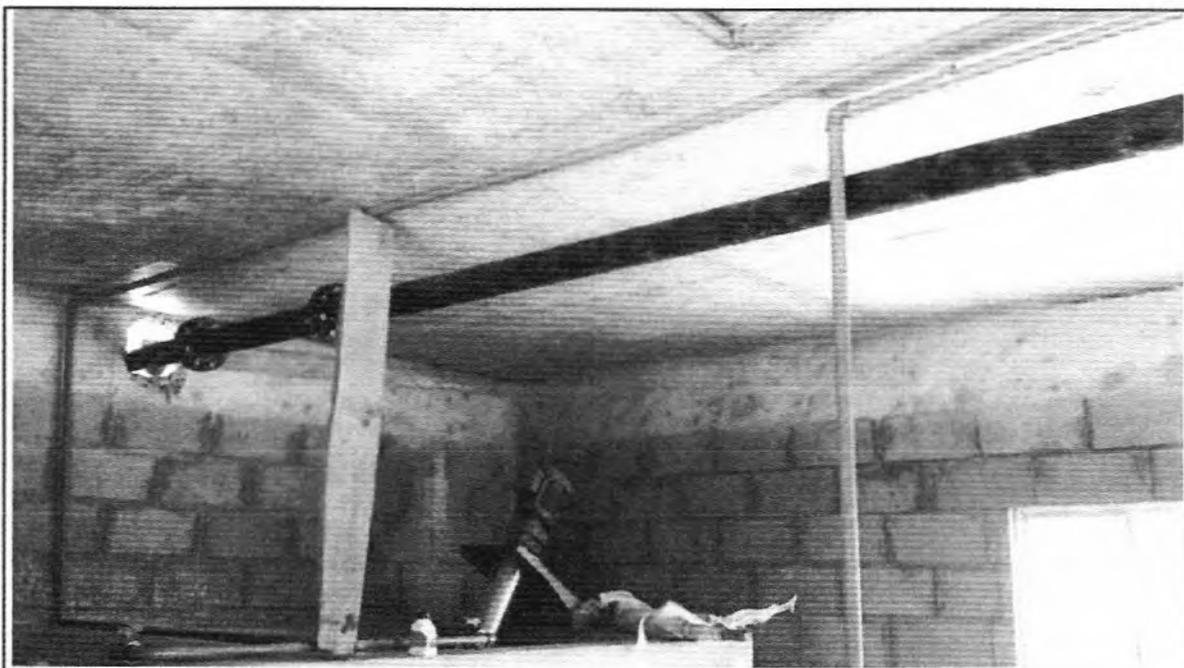

**Descrição:** Assentamento da tubulação da EE de Lodo para o Decanter.

**Foto:** 09

**Data:** 03/10/14

**Arquivo:** 104904

DTE-078/14  
São Paulo, 13 de Outubro de 2.014.

Ao  
**Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Taquaritinga - SAAET**  
Rua Clineu Braga de Magalhães, 911  
CEP 15900-000 - Centro  
Taquaritinga - SP

At.: Satoshi Yokoyama  
Superintendente

Ref.: Contrato nº 045/2013 - Prestação de serviços técnicos especializados de engenharia no Gerenciamento de Obras de Saneamento / Esgotos / Estação de Tratamento - ETE

Ass.: Relatório Mensal do Acompanhamento Físico e Financeiro / Apresentação  
Mês 09/2.014 (R0)

Prezados Senhores (as),

Vimos com o presente, encaminhar a VS.as, para apreciação e considerações, 01 (uma) via impressa e 01 (uma) via em arquivo digital (extensão .pdf), do relatório de mensal do acompanhamento físico e financeiro das obras da Estação de Tratamento de Esgotos (ETE), objeto do contrato em referência, conforme discriminação a seguir:

- Relatório Mensal do Acompanhamento Físico e Financeiro – Mês 09/2.014, Revisão 0 (N/Ref.: GE-174-RE-AM-009-R0).

Sendo o que nos apresenta para o momento, despedimo-nos.

Atenciosamente,



Engº Francisco José Júst,  
Sócio-Gerente



## SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE TAQUARITINGA

**CONTRATO Nº 045/2013 - GERENCIAMENTO DE OBRAS DE SANEAMENTO / ESGOTOS /  
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO - ETE**

**RELATÓRIO MENSAL DAS ATIVIDADES – PERÍODO 01 A 30/09/2.014**

**N/REF.: GE-174-RE-MA-009-R0  
TAQUARITINGA -SP  
SETEMBRO/2014**



**APRESENTAÇÃO**

Apresenta-se a seguir o "Relatório Mensal das Atividades – Período 01 a 30/09/2014" desenvolvidas no Gerenciamento das Obras da Estação de Tratamento de Esgotos – ETE a ser implantada para o Sistema de Esgotos Sanitários (SES) da cidade de Taquaritinga, em consonância com a Autorização de Serviço de 03/01/2014, para o Contrato nº 045/2013, firmado em 30/12/2013, entre o SAAET - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Taquaritinga e a PERTÉCNICA HSMA Consultoria e Projetos Ltda.

**ÍNDICE**

- 1 - DADOS DO EMPREENDIMENTO**
- 2 - OS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DAS OBRAS CONTRATADOS**
- 3 - AS OBRAS CONTRATADAS**
- 4 - ATIVIDADES NO PERÍODO 01 A 30/09/2014**
- 5 - DOCUMENTÁRIO FOTOGRÁFICO**
- 6 - DESENHOS**

<b>1 - DADOS DO EMPREENDIMENTO</b>
------------------------------------

## 1 - DADOS DO EMPREENDIMENTO

- **Agente Promotor:** Governo do Estado de São Paulo / Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos / Departamento de Águas e Energia Elétrica - DAEE
- **Agente Financeiro e Técnico:** Departamento de Águas Energia Elétrica - DAEE
- **Objeto:** Obras de Implantação de Sistema de Afastamento e Tratamento de Esgotos Sanitários de Taquaritinga (Sede)
- **Recursos:**
  - . Fonte: Programa Água Limpa;
  - . Convênio nº 2011/33/00335.9, de 29/12/2.011;
  - . Valor: R\$ 14.491.618,13 – Exercício 2011;
  - . Prazo: 24 meses
- **Agente Executor:** Prefeitura Municipal de Taquaritinga - SP
- **Contrato das obras e serviços:**
  - . Processo licitatório: Concorrência nº 011/12;
  - . Contrato nº 194/12, de 11/12/2.012;
  - . Contratado: KMG Consultoria e Engenharia Ltda.;
  - . Valor: R\$ 11.431.936,13;
  - . Prazo: 18 meses após Ordem de Serviço;
  - . Ordem de Serviço de 17/12/2.012; Término: 18/06/2.014;
  - . Aditivo contratual de valor (Termo Aditivo 001/2013): R\$ 2.817.533,01 (24,65%), em 31/12/2.013;
  - . Valor contratual aditivado: R\$ 14.249.469,14;
  - . Aditivo de prazo contratual (Termo Aditivo 001/2014): em 11/06/2.014, prorrogado em 90 (noventa) dias a contar de 18/06/2.014.
  - . Aditivo de prazo contratual (Termo Aditivo 002/2014): em 15/09/2.014, prorrogado em 90 (noventa) dias a contar de 18/12/2.014.

**2 - OS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DAS OBRAS CONTRATADOS**

## **2 – OS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DAS OBRAS CONTRATADOS**

O escopo dos trabalhos é a prestação de serviços de Gerenciamento das Obras do Sistema de Afastamento e Tratamento de Esgotos Sanitários de Taquaritinga (Sede), licitadas pela Prefeitura Municipal de Taquaritinga através da Concorrência nº 011/2012, que resultou no Contrato nº 194/12, firmado com a empresa KMG Consultoria e Engenharia Ltda..

Os serviços do Gerenciamento deverão fornecer suporte técnico e operacional ao Serviço Municipal de Água e Esgoto de Taquaritinga – SAAET, na gestão da implantação do Sistema de Afastamento e Tratamento de Esgotos Sanitários, de modo a assegurar que os projetos e obras sejam executados de acordo com o cronograma físico-financeiro contratados pela Prefeitura Municipal de Taquaritinga, com a qualidade necessária definida nos projetos, memoriais descritivos e pelas normas brasileiras, gerenciando de maneira confiável e eficaz as seguintes frentes de trabalho:

- Fiscalização e acompanhamento das obras e adequações realizadas pelas empreiteiras para atendimento a alterações definidas por órgãos públicos ou equivalentes, tais como concessionárias de serviços públicos, dentre outros;
- Elaboração de elementos técnicos para processos de contratação de projetos, obras e serviços;
- Acompanhamento da elaboração e compatibilização de projetos complementares;
- Acompanhamento dos cronogramas das obras das edificações;
- Acompanhamento dos cronogramas das obras de infraestrutura e compatibilização dos mesmos com o cronograma geral do empreendimento;
- Acompanhamento da execução de serviços relativos à infraestrutura, envolvendo serviços preliminares, terraplenagem, micro e macro drenagem, contenções, redes de abastecimento de água, redes coletoras de esgoto, redes de energia elétrica, pavimentação, obras de arte em concreto, urbanização e paisagismo que se aplicarem a implantação em foco;
- Registro e organização do arquivo "as-built" como referência essencial para realização de manutenções e eventuais reparos após a implantação do empreendimento;
- Realização de consultoria técnica especializada para solução de problemas específicos relacionados ao projeto, à construção ou ao licenciamento/regularização das obras;
- Realização de atividades de Pré-Operação (Comissionamento):
- Todos os demais serviços que venham a ser identificados como necessários para a viabilização do empreendimento e para atendimento das funcionalidades desejadas e estabelecidas pelo SAAET.

**3 - AS OBRAS CONTRATADAS**

### 3 - AS OBRAS CONTRATADAS

As obras foram licitadas e contratadas pela Prefeitura Municipal de Taquaritinga com a empresa KMG Consultoria e Engenharia Ltda., de acordo o Projeto Básico das Obras do Sistema de Afastamento e Tratamento de Esgotos Sanitários de Taquaritinga, elaborado pela empresa Engecorps – Corpo de Engenheiros Consultores Ltda., em Dezembro/2.009, contratada pelo Departamento de Águas Energia Elétrica – DAEE, para a execução de Projetos de Sistemas de Esgoto Sanitário, dentro do Projeto Água Limpa, Lote 1.

Ao longo da execução das obras, o Projeto Básico Engecorps – 12/2.009 foi revisado pela KMG, em função, entre outras justificativas, para atender as demandas projetadas para a população urbana de Taquaritinga, evoluídas a partir dos dados populacionais atualizados disponibilizados pelo Censo IBGE/2.010. A KMG subcontratou a revisão dos projetos com a empresa Sistemas Ambientais Engenharia, Consultoria e saneamento Ltda.

O quadro 1 a seguir discrimina as Obras do Sistema de Afastamento e Tratamento de Esgotos Sanitários de Taquaritinga (Sede), licitadas e contratadas com KMG, bem como, valores aditados ao contrato em função da revisão do Projeto Básico.

**- Quadro 1 - Obras do Sistema de Afastamento e Tratamento de Esgotos Sanitários de Taquaritinga**

ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES CONTRATUAIS (R\$)	
		ORIGINAL	COM ADITIVO
1	EMISSÁRIO BRUTO EMB01	32.367,61	24.883,38
2	EEE FINAL	732.407,51	870.040,40
3	LINHA DE RECALQUE	138.249,42	101.659,03
4	MOVIMENTO DE TERRA ETE	329.817,66	329.817,66
5	GUARITA	38.884,13	39.272,44
6	ADMINISTRAÇÃO	167.384,94	160.426,38
7	GRADEAMENTO E DESARENAÇÃO	586.074,91	557.236,70
8	REATORES ANAERÓBICOS 1 E 2	1.842.451,97	3.164.878,20
9	FILTROS BIOLÓGICOS 1 E 2	1.738.586,37	2.527.587,55
10	DECANTADORES SECUNDÁRIOS 1 E 2	1.066.535,54	1.704.851,46
11	EE DE RECIRCULAÇÃO	485.284,77	612.831,78
12	CÂMARA DE CONTATO	382.806,39	382.806,39
13	CASA DE DESIDRATAÇÃO DE LODO	306.118,28	303.715,24
14	EE DE LODO ADENSADO	70.946,26	74.582,26
15	ADENSADOR DE LODO	154.552,19	0,00
16	TANQUES DE HIPOCLORITO	151.058,56	151.058,56
17	EFLUENTE FINAL	415.844,16	184.121,55
18	INTERLIGAÇÕES DO SISTEMA	582.679,84	737.470,25
19	SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	44.414,70	47.836,89
20	SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL	257.978,71	207.325,28
21	CAIXAS DE FLUXO 1, 2 E 3	393.197,26	417.382,13
22	URBANIZAÇÃO DA ETE	834.620,53	723.344,73
23	SERVIÇO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	574.674,42	574.674,42
24	SUPERVISÃO E CONTROLE	105.000,00	105.000,00
25	PROJETO	0,00	60.000,00
26	SISTEMA DE DRENAGEM SUBTERRÂNEA	0,00	186.666,46
	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>11.431.936,13</b>	<b>14.249.469,14</b>

**4 – ATIVIDADES NO PERÍODO 01 A 30/09/2014**

#### 4 – ATIVIDADES NO PERÍODO 01 A 30/09/2014

##### 4.1 - Equipe Técnica

O quadro a seguir, indica a relação nominal e qualificação dos profissionais de nível superior componentes da equipe técnica alocada para o desenvolvimento das atividades da Gerenciadora no período de 01 a 31/08/14:

NOME	FORMAÇÃO	CATEGORIA PROFISSIONAL	EXPERIÊNCIA (ANOS)	QUALIFICAÇÃO
Francisco José Justo	Eng <sup>a</sup> Sanitária	Eng <sup>o</sup> Senior	30	Responsabilidade técnica do contrato e do gerenciamento das obras
Francisco M. Raposo	Eng <sup>a</sup> Civil	Eng <sup>o</sup> Senior	36	Coordenação do gerenciamento de obras
Maurício Lopes Brandão	Eng <sup>a</sup> Civil	Eng <sup>o</sup> Senior	21	Consultoria e gerenciamento de obras de Saneamento Ambiental
Guilherme Georgetti Fernandes	Eng <sup>a</sup> Ambiental	Eng <sup>a</sup> Júnior	03	Gerenciamento de obras de Saneamento Ambiental

##### 4.2 - Atividades desenvolvidas pela Gerenciadora no período de 01 a 30/09/2014:

Embora a empreiteira KMG tenha protocolado junto a P.M.Taquaritinga (Protocolo nº 0000006002/2014) o ofício nº C.KMG-90/2014, datado de 25/07/2014, informando a paralisação imediata dos serviços, por não receber resposta ao ofício nº C.KMG-88/2014, datado de 04/06/2014 e por não recebimento dos valores de reajustes do contrato, as obras foram continuadas no período, porém, com drástica redução do número de operários.

##### 4.2.1 - Acompanhamento da construção civil das unidades

###### → Estação Elevatória Final

- Instalação da haste da talha da unidade.

###### → Desarenador

- Reaterro do talude da unidade;
- Reboco da escada da unidade.

###### → Reatores

- Execução das escadas de acesso das lajes dos Reatores 1 e 2;
- Reboco da escada do Reator 1.

###### → Casa Desidratação de Lodo

- Execução da escada e calçada de acesso ao painel de controle da unidade.

###### → Caixa de Fluxo

- Montagem de armadura e forma da escada da Caixa de Fluxo 1;
- Concretagem da escada da Caixa de Fluxo 1;
- Montagem de armadura e forma dos pilares da escada da Caixa de Fluxo 2;
- Concretagem dos pilares da escada da Caixa de Fluxo 2.

- Estação Elevatória Recirculação  
- Instalação da haste da talha da unidade.

- Tanque de Contato  
- Regularização do talude para plantio de grama;  
- Limpeza da canaleta de águas pluviais.

#### 4.2.2 - Acompanhamento da execução hidráulica das unidades.

- Estação Elevatória de Recirculação  
- Assentamento da tubulação do extravasor da EE de Recirculação ( $\varnothing$  250 – F°F° - L = 4,10m);  
- Assentamento da tubulação do dreno da canaleta de contenção da EE de Recirculação ( $\varnothing$  100 – F°F° - L = 7,00 m).

#### 4.2.3 - Acompanhamento da montagem dos equipamentos das unidades

- Casa de Paineis  
- Cabeamento da Casa de Paineis 3 aos Decantadores 1 e 2;  
- Cabeamento da Casa de Paineis 3 a Caixa de Manobra 1;  
- Cabeamento da Casa de Paineis 3 a EE de Recirculação;  
- Cabeamento da Casa de Paineis 3 ao Tanque de Hipoclorito;  
- Cabeamento da Casa de Paineis 3 ao Tanque de Contato;  
- Instalação dos cabos da Casa de Paineis 2 à Casa de Paineis 3;  
- Instalação dos cabos da Casa de Paineis 3 à Válvula tipo Guilhotina da Caixa de Manobra 1.

- Casa Desidratação de Lodo  
- Instalação do painel de comando da unidade.

#### 4.2.4 - Acompanhamento da urbanização da ETE

- Urbanização  
- Abertura de vala para execução de boca lobo na rua principal da ETE;  
- Regularização do talude para plantio de grama;  
- Assentamento das tampas (F°F°) dos Poços de Visitas (PV's) da Galeria de Águas Pluviais (GAP);  
- Execução das bocas de lobo na rua principal da ETE;  
- Gabarito de guia/ sarjeta;  
- Concretagem da calçada na rua principal da ETE.  
- Instalação dos fios do poste de energia central para o transformador da ETE.

Obs.: Guarita e Administração estão com a rede elétrica funcionando.

#### 4.2.5 - Dados gerais

- Em média a obra contou com 10 operários, trabalhando em 2 turnos, das 7:00 às 12:00h e 13:00 às 17:00h, constando:

- 04 ajudantes;
- 03 pedreiros;
- 01 encarregados;
- 01 eng. Elétrico
- 01 técnico de segurança

- Os operários estavam com EPI's.
- No período não ocorreram acidentes de trabalho.
- Não foram constatadas chuvas no período.
- Foram terceirizados os seguintes serviços:
  - Máquinas e operadores;
  - Caminhão betoneira e operador.

#### 4.2.6 – Acompanhamento Físico-Financeiro das Obras e Serviços

Não foi realizada medição das obras e serviços no período entre 01 e 30/09/2.014.

A planilha à frente, indica a posição física e financeira acumulada das Obras do Sistema de Afastamento e Tratamento de Esgotos Sanitários de Taquaritinga (Sede), até a Medição nº 19, realizada no período imediatamente anterior (01 a 30/06/2.014).




PREÇOS (R\$)					
	REALIZ. NO PERÍODO	TOTAL	REALIZ. ANTERIOR (%)	REALIZ. NO PERÍODO (%)	REALIZ. TOTAL (%)
30	2.987,54	22.009,44	76,44%	12,01%	88,45%
72	582,85	869.457,57	99,87%	0,07%	99,93%
35	115,00	103.551,85	101,75%	0,11%	101,86%
32	0,00	329.817,92	100,00%	0,00%	100,00%
12	0,00	39.272,42	100,00%	0,00%	100,00%
36	0,00	160.426,36	100,00%	0,00%	100,00%
15	1.748,55	556.071,00	99,48%	0,31%	99,79%
54	31.329,54	3.144.975,18	98,38%	0,99%	99,37%
31	2.914,25	2.527.584,26	99,88%	0,12%	100,00%
20	1.748,55	1.703.685,75	99,83%	0,10%	99,93%
31	1.748,55	611.666,16	99,52%	0,29%	99,81%
15	1.748,55	381.640,70	99,24%	0,46%	99,70%
33	1.748,55	302.549,58	99,04%	0,58%	99,62%
42	582,85	74.582,27	99,22%	0,78%	100,00%
00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
96	582,85	150.475,71	99,23%	0,39%	99,61%
55	800,00	183.441,55	99,20%	0,43%	99,63%
27	3.027,97	737.470,24	99,59%	0,41%	100,00%
54	4.183,51	47.254,05	90,04%	8,75%	98,78%
05	1.748,55	206.159,60	98,59%	0,84%	99,44%
55	1.481,47	417.382,12	99,65%	0,35%	100,00%
74	11.645,50	712.149,24	96,84%	1,61%	98,45%
10	115.980,54	518.252,64	70,00%	20,18%	90,18%
00	10.500,00	10.500,00	0,00%	10,00%	10,00%
00	1.748,55	61.748,55	100,00%	2,91%	102,91%
20		183.752,20	98,44%	0,00%	98,44%
54	198.963,72	14.055.876,36	97,25%	1,40%	98,64%

193.592,78

1,36%



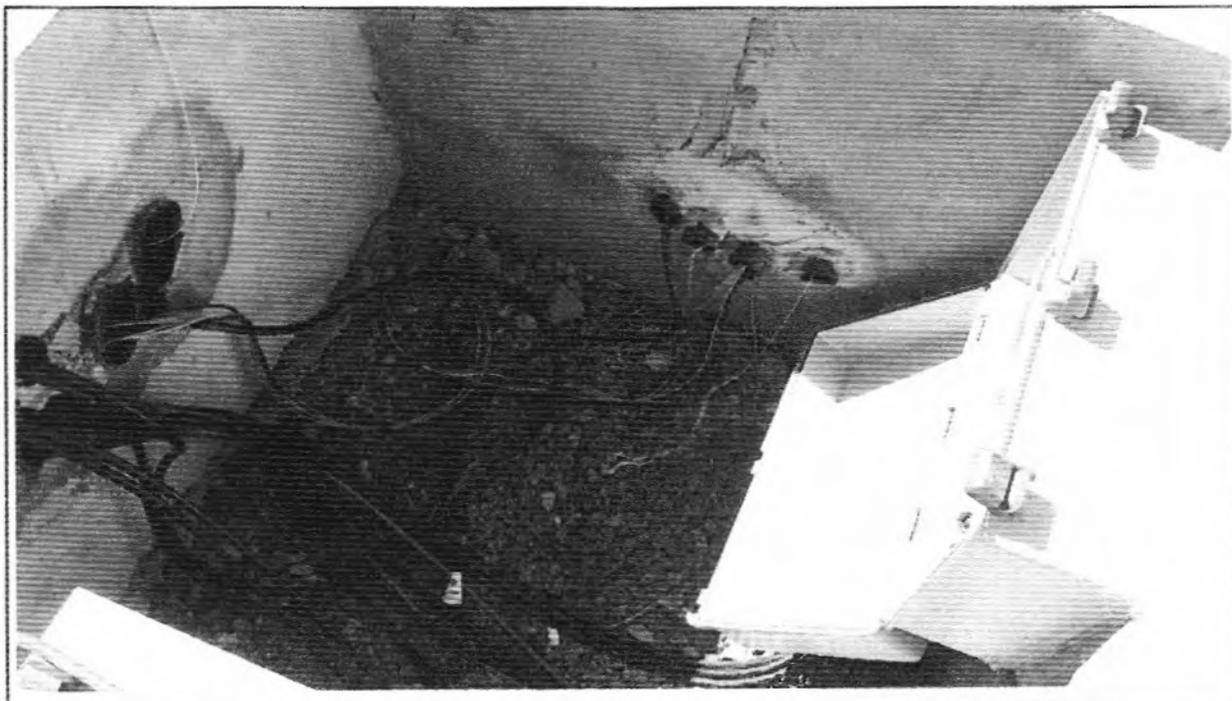


**Descrição:** Cabeamento da Casa de Painel 3 a EE de Recirculação.

**Foto:** 01

**Data:** 05/09/14

**Arquivo:** 100659

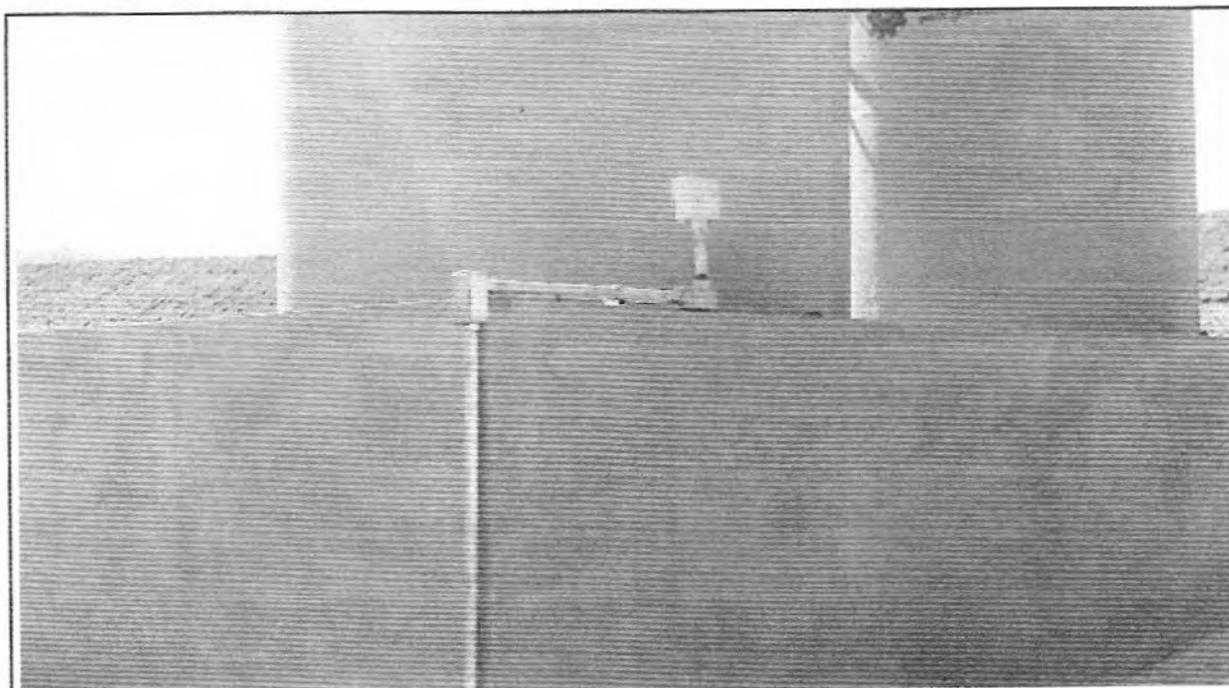


**Descrição:** Cabeamento da Casa de Painel 3 ao Tanque de Hipoclorito.

**Foto:** 02

**Data:** 05/09/14

**Arquivo:** 101014

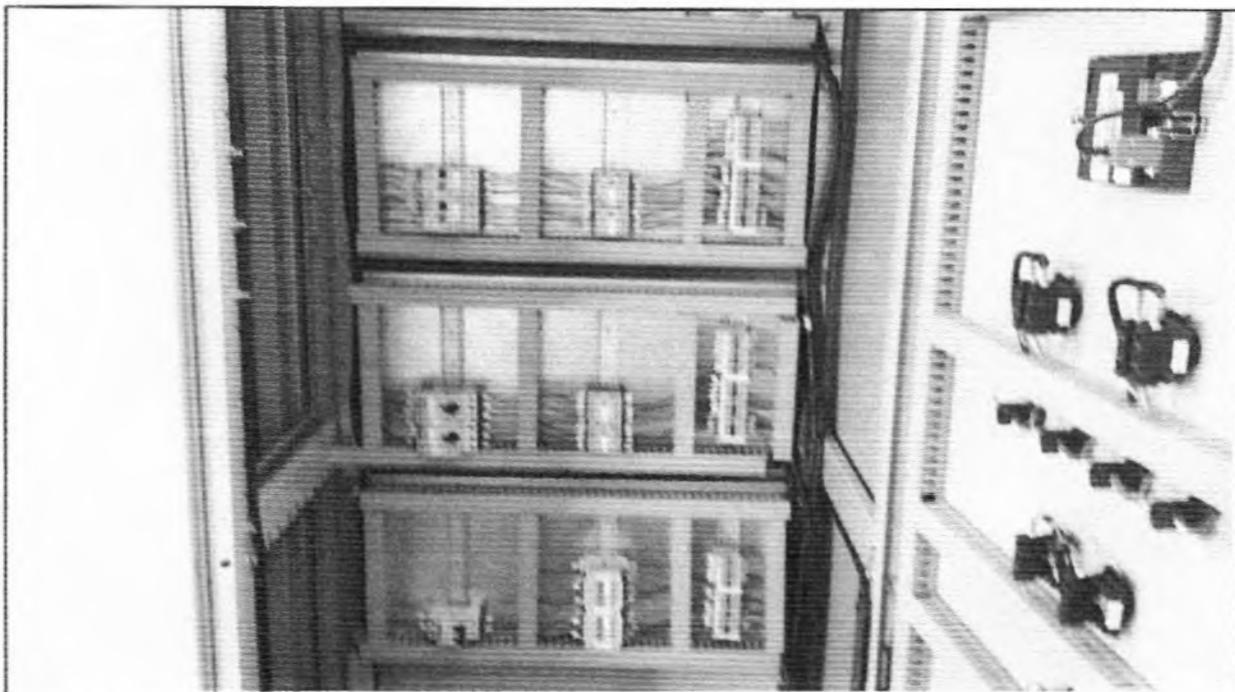

**Descrição:** Painel de controle da Casa de Painel 3.

**Foto:** 03

**Data:** 05/09/14

**Arquivo:** 101147



**Descrição:** Abertura de vala para execução de Boca Lobo na rua principal da ETE

**Foto:** 04

**Data:** 05/09/14

**Arquivo:** 102728



**Descrição:** Assentamento da tubulação do dreno da canaleta de contenção da EE de Recirculação.

**Foto:** 05

**Data:** 05/09/14

**Arquivo:** 103700




**Descrição:** Assentamento das tampas (F°F°) dos PV's da GAP.

**Foto:** 06

**Data:** 05/09/14

**Arquivo:** 103801

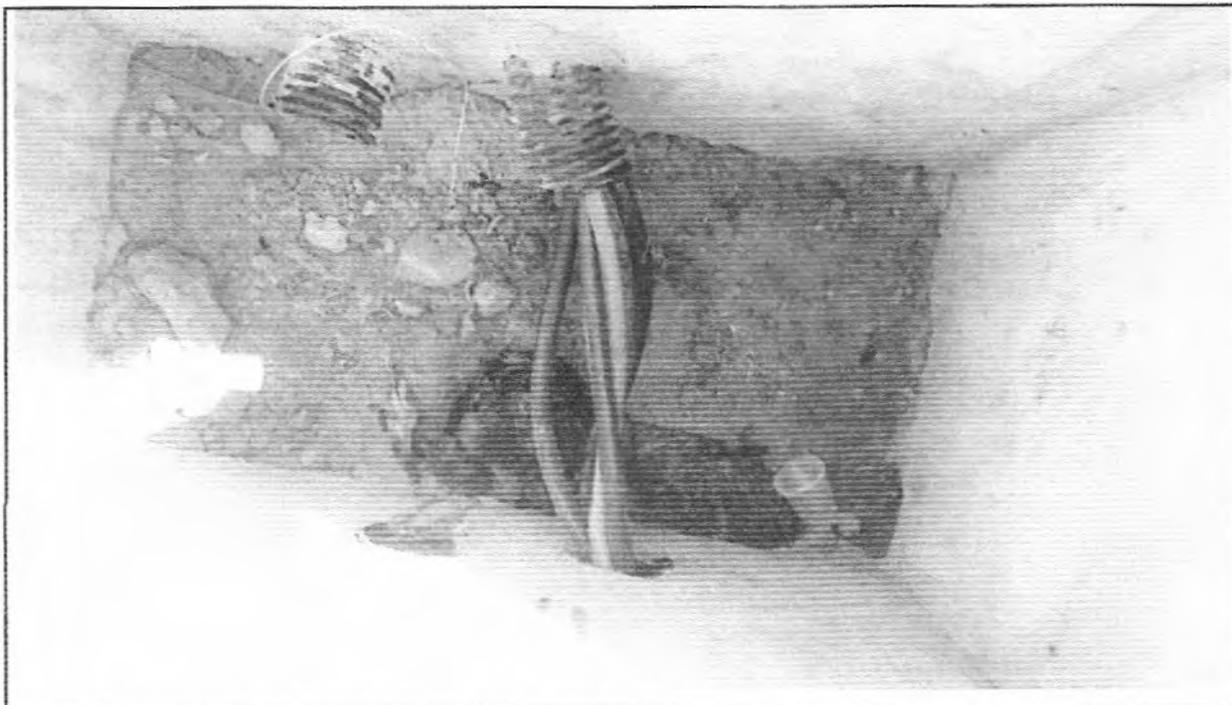


**Descrição:** Instalação dos cabos da Casa de Painei 2 à Casa de Painei 3.

**Foto:** 07

**Data:** 12/09/14

**Arquivo:** 095514

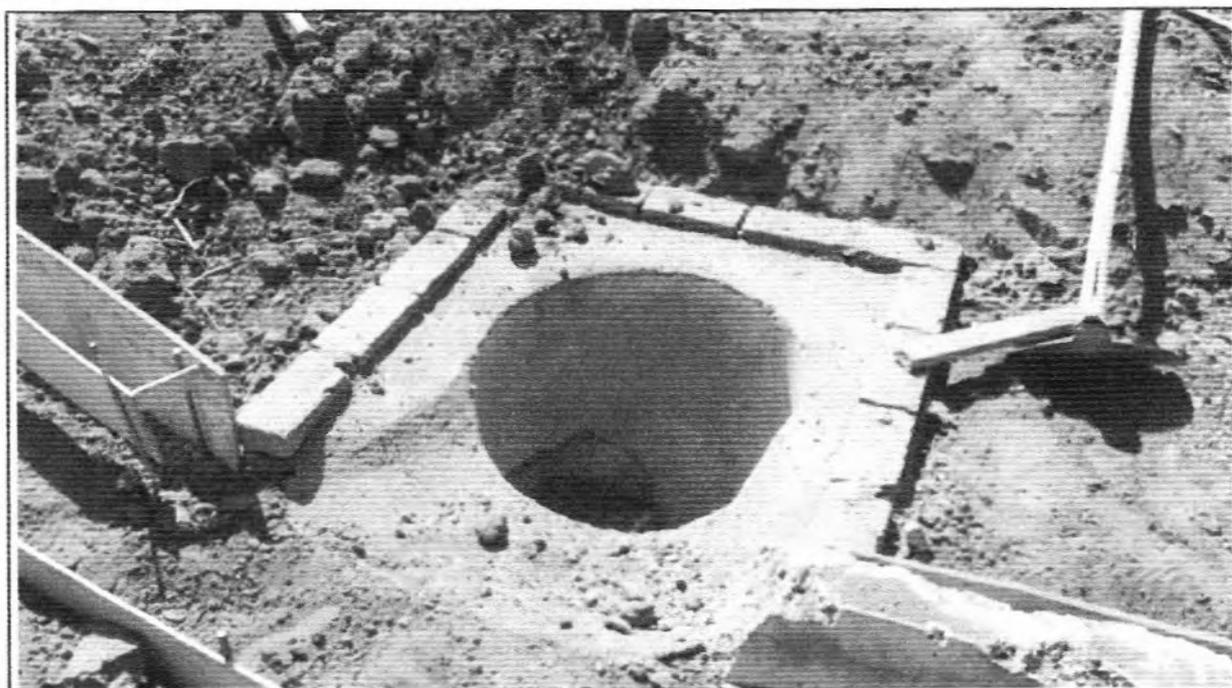

**Descrição:** Execução da boca de lobo na rua principal da ETE.

**Foto:** 08

**Data:** 12/09/14

**Arquivo:** 100815




**Descrição:** Gabarito de guia/ sarjeta.

**Foto:** 09

**Data:** 12/09/14

**Arquivo:** 100822

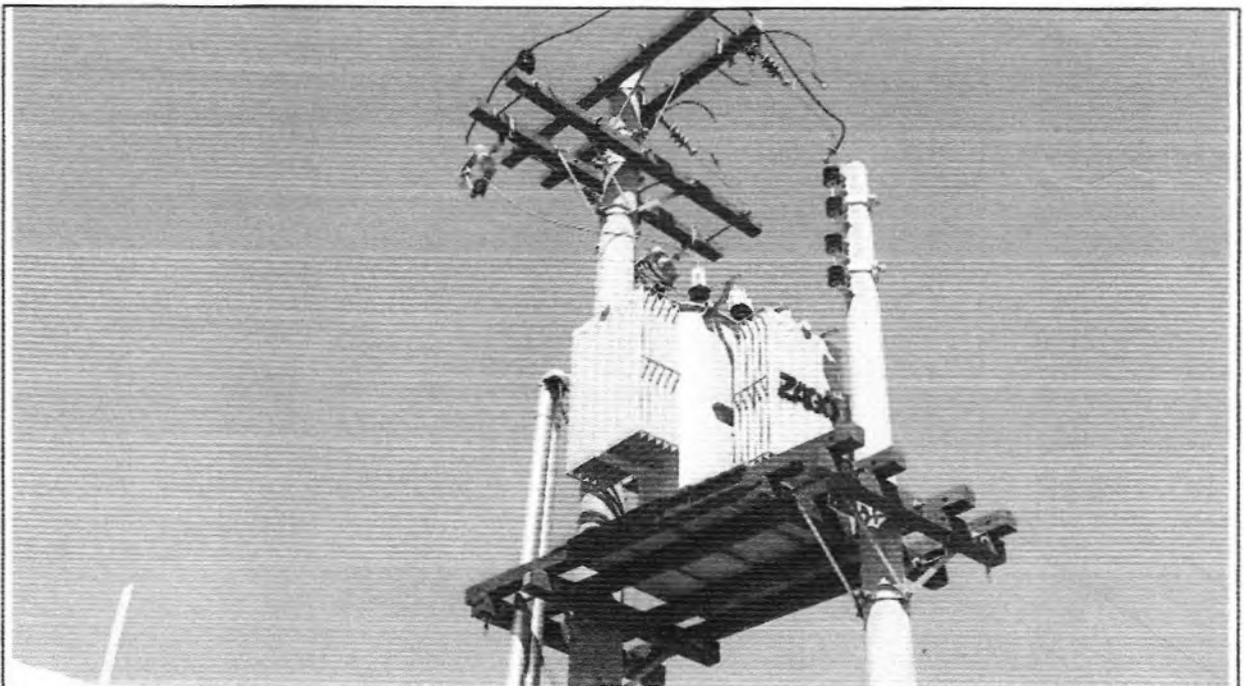

**Descrição:** Instalação dos cabos do poste de energia central para o transformador da ETE.

**Foto:** 10

**Data:** 12/09/14

**Arquivo:** 101419



**Descrição:** Regularização do talude para plantio de grama.

**Foto:** 10

**Data:** 12/09/14

**Arquivo:** 102000




**Descrição:** Instalação da haste da talha da EE Recirculação.

**Foto:** 11

**Data:** 12/09/14

**Arquivo:** 102238

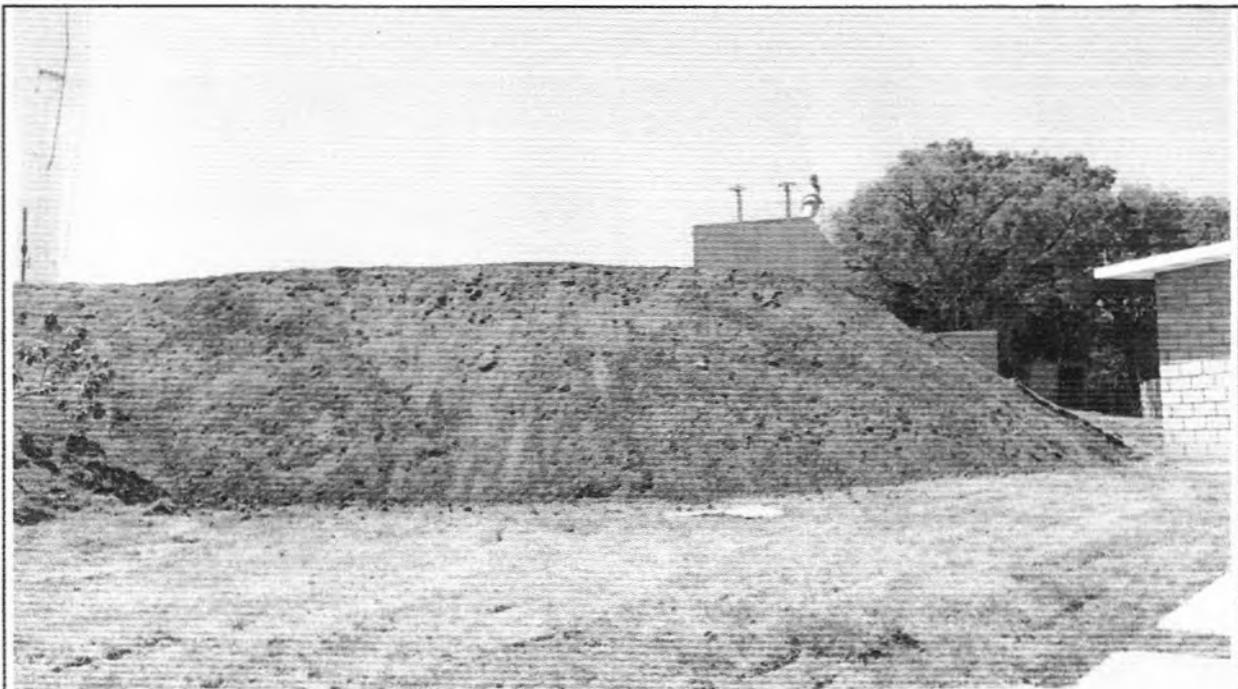


**Descrição:** Reaterro do talude do Desarenador.

**Foto:** 12

**Data:** 22/09/14

**Arquivo:** 103330

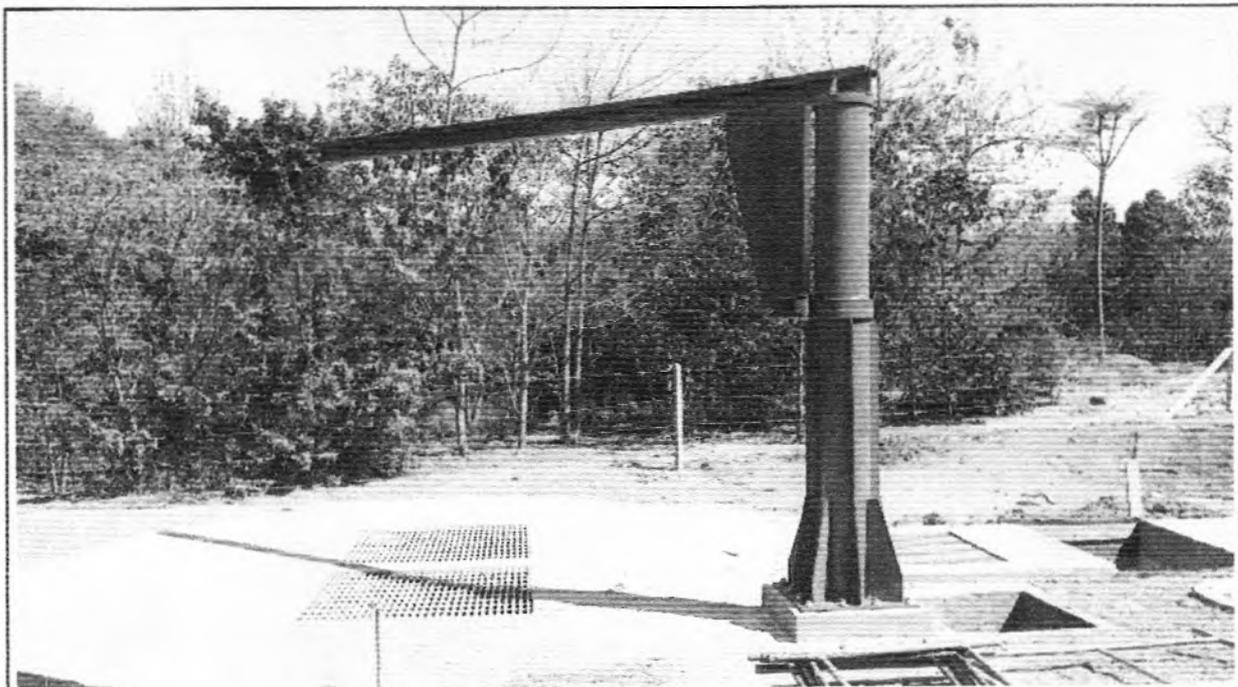


**Descrição:** Instalação da haste da talha da EE Final.

**Foto:** 13

**Data:** 12/09/14

**Arquivo:** 101650

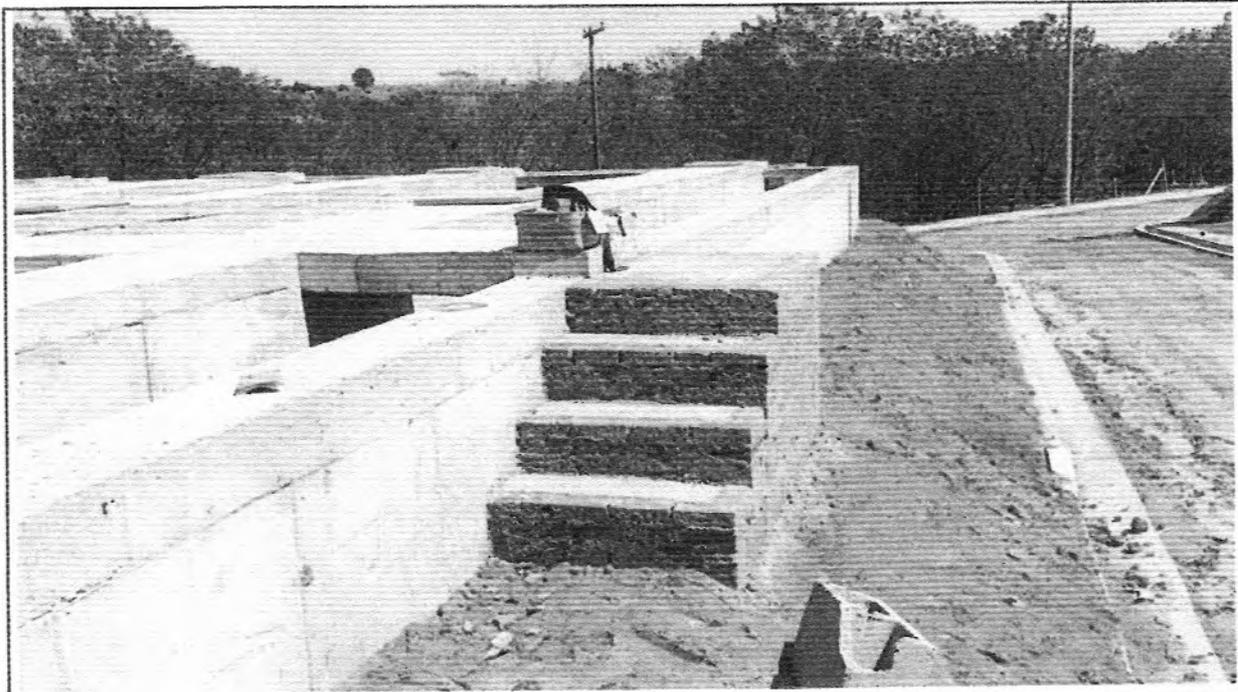


**Descrição:** Execução da escada de acesso da laje do Reator 1

**Foto:** 14

**Data:** 22/09/14

**Arquivo:** 103442

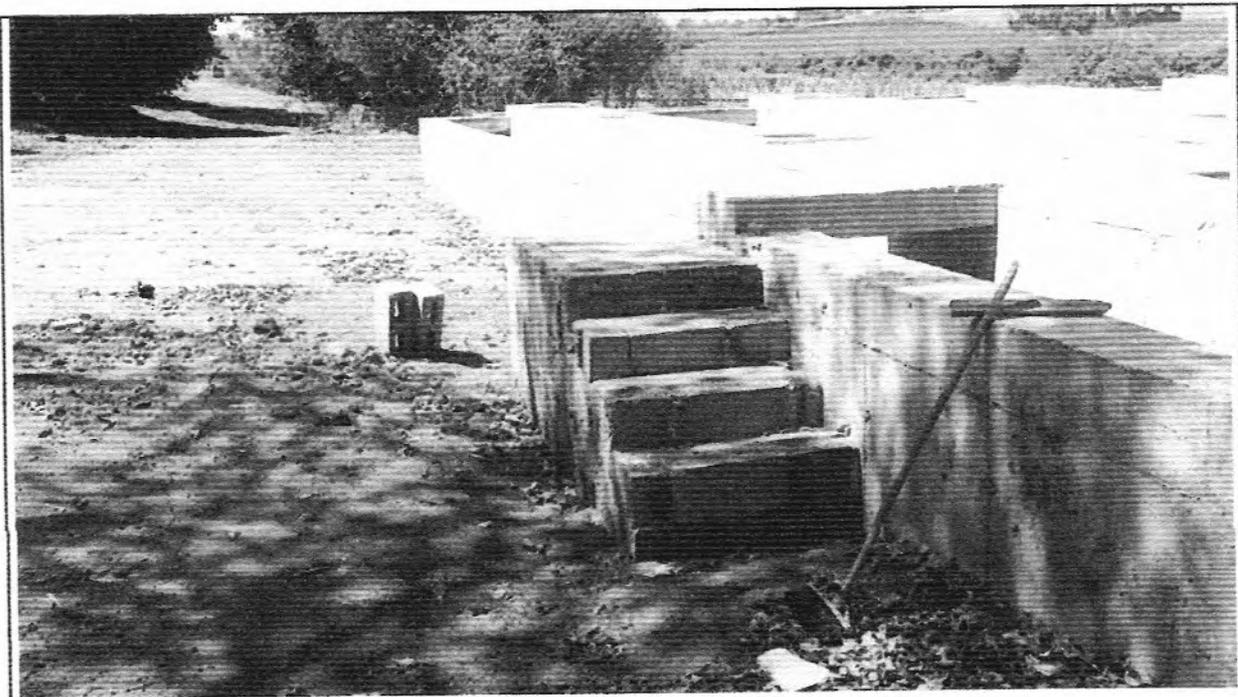

**Descrição:** Execução da escada de acesso da laje do Reator 2.

**Foto:** 15

**Data:** 22/09/14

**Arquivo:** 103502



**Descrição:** Execução da escada e calçada de acesso ao painel de controle da Casa Desidratação de Lodo.

**Foto:** 16

**Data:** 22/09/14

**Arquivo:** 110553



**Descrição:** Instalação dos cabos da Casa de Painel 3 à Válvula tipo Guilhotina da Caixa de Manobra 1.

**Foto:** 17

**Data:** 22/09/14

**Arquivo:** 104524



**Descrição:** Regularização do talude e plantio de grama no entorno do Tanque de Contato

**Foto:** 18

**Data:** 22/09/14

**Arquivo:** 103923




**Descrição:** Concretagem da calçada na rua principal da ETE.

**Foto:** 19

**Data:** 26/09/14

**Arquivo:** 101601

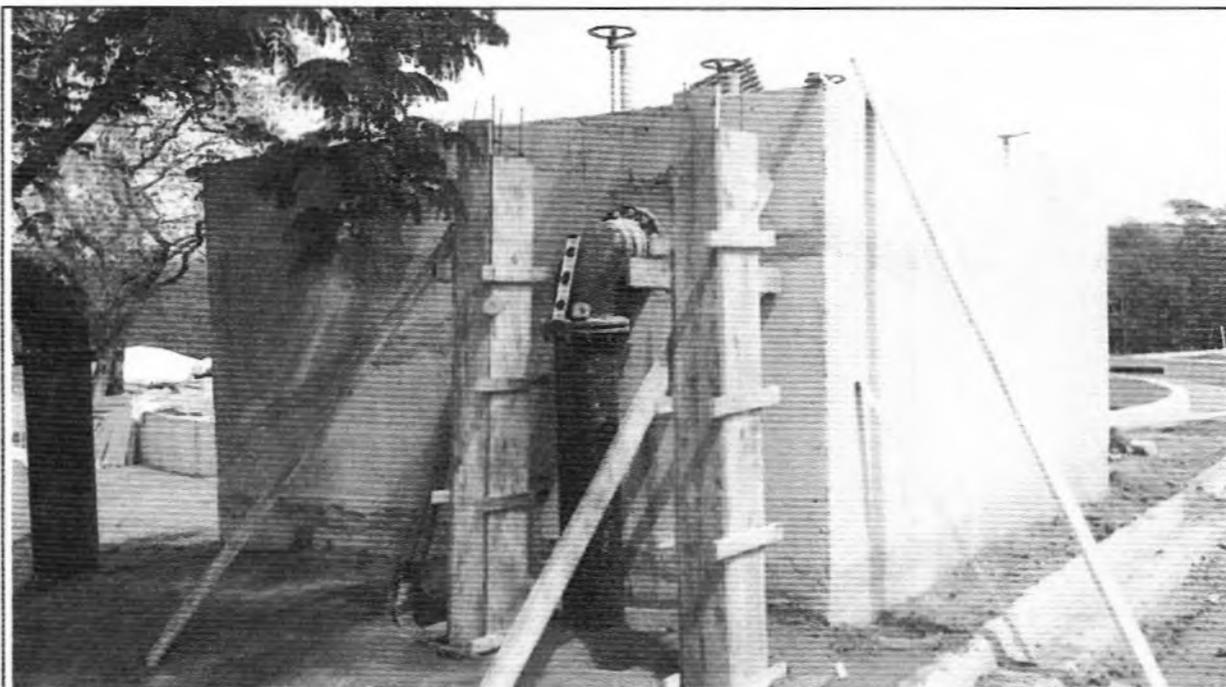

**Descrição:** Montagem de armadura e forma dos pilares da escada da Caixa de Fluxo 2.

**Foto:** 20

**Data:** 26/09/14

**Arquivo:** 101752



**Descrição:** Reparos de guia/ sarjeta.

**Foto:** 21

**Data:** 26/09/14

**Arquivo:** 101525



**Descrição:** Instalação do painel de comando da Casa Desidratação de Lodo.

**Foto:** 22

**Data:** 26/09/14

**Arquivo:** 101336



**Descrição:** Reboco da escada do Desarenador.

**Foto:** 23

**Data:** 26/09/14

**Arquivo:** 102214



**Descrição:** Reboco da escada do Reator 1.

**Foto:** 24

**Data:** 26/09/14

**Arquivo:** 102101



**Descrição:** Concretagem da escada da Caixa de Fluxo 1

**Foto:** 25

**Data:** 26/09/14

**Arquivo:** 102130



**6 - DESENHOS****“Relação de Desenhos”**

Item	Título	Nº Desenho Contratada	Escala	Formato	Rev.
1	DAEE – TAQUARITINGA – ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO – DISPOSIÇÃO GERAL - FI. 01/01	1015-DAE-PEM-TA-A1-E061	1:2.500	A1	0
2	IMPLANTAÇÃO - FI. 01/01	KMG s/nº	1:500	A1	0

-  BUEIRO
-  SENTIDO DO FLUXO
-  PONTO COTADO
-  ESTACA DO PROJETO
-  FURO DE SONDAGEM



SECRETARIA DE SANEAMENTO E ENERGIA  
 DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA

EXECUÇÃO DE PROJETOS DE SISTEMAS DE ESGOTO SANITÁRIO  
 PROJETO ÁGUA LIMPA  
 LOTE 1

**TAQUARITINGA**  
 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO  
 DISPOSIÇÃO GERAL

Nº	
REV.: 0	FL.: 1/1
Nº CONTRATADA 1015-DAE-PEM-TA-A1-E061	
ESCALA: 1:2500	

SAET  
1693  
JANUARY 1951



DAF-079/14

São Paulo, 13 de Outubro de 2.014.

Ao

**Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Taquaritinga - SAAET**

Rua Clineu Braga de Magalhães, 911

CEP 15900-000 - Centro

Taquaritinga - SP

At.: Satoshi Yokoyama  
Superintendente

Ref.: Contrato nº 045/2013 - Prestação de serviços técnicos especializados de engenharia no Gerenciamento de Obras de Saneamento / Esgotos / Estação de Tratamento - ETE

Ass.: Medição dos serviços / Medição 09 - Apresentação e pedido de liberação para o pagamento / Envio de nota, guias recolhidas de encargos sociais e tributários

Prezados Senhores (as),


Vimos com o presente, apresentar a V.S.as e solicitar liberação para o pagamento, da Medição 03 dos serviços realizados no mês 09/2.014, correspondentes a R\$ 40.138,63 (quarenta mil, cento e trinta e oito reais e sessenta e três centavos), conforme desembolso previsto nos Cronogramas Físico e Financeiro do contrato em referência.

Aproveitamos a oportunidade, para encaminhar em anexo:

- Nota de Débito de Serviços Profissionais nº 237 para o pagamento dos serviços prestados;
- Cópias das guias de recolhimentos dos encargos sociais exigíveis - GRF FGTS competência 09/2.014 e GPS INSS competência 08/2.014;
- Cópia da guia de recolhimento do Imposto Sobre Serviços (ISS) incidente no mês 10/2.014, relativa ao 3º Trimestre (Julho, Agosto e Setembro) de 2.014, a qual reflete a totalidade do referido imposto devido por esta empresa, informando que somos prestadores de serviços inscritos na cidade de São Paulo, sob a forma de sociedades de profissionais, de acordo com Art. 15, da Lei Municipal 13.701/03 (Declaração Cadastral i006328/2014 em anexo) e, na forma definida em lei, conforme Portaria SF 014/2004, o ISS deve ser recolhido trimestralmente (próximo recolhimento: trimestre dos meses 10, 11 e 12/2.014, em 10/01/2.015). Maiores informações, poderão ser obtidas no sítio da PMSP e respectivo endereço: <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/financas/servicos/iss>.

Sendo o que nos apresenta para o momento, despedimo-nos.

Atenciosamente,



Engº Francisco José Justo  
Sócio-Gerente



### Emissão de comprovantes

08/10/2014 19:59:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 19.59.36  
6806306806 SEGUNDA VIA 0015

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PERTECNICA C E P S-C LT  
AGENCIA: 6806-3 CONTA: 608-4  
-----  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRP  
Codigo de Barras 85800000005-4 15020179141-5  
00757305087-0 36672710001-9  
Data do pagamento 07/10/2014  
CNPJ/CEI 73667271/0001-79  
COMPETENCIA 09/2014  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/10/2014  
VALOR DEPOSITO 515,02  
Valor Total 515,02  
-----  
DOCUMENTO: 100701  
AUTENTICACAO SISBB: B.88F.15F.6F8.BFD.8E8

Transação efetuada com sucesso por: J1950079 FRANCISCO JOSE JUSTO.

**FGTS**

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 28/09/2014 - 09:04:50

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PERTECNICA HSMA CONSUL PROJ LIMITADA				02-DDD/TELEFONE (0011)30612549
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 6.437,84	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 73.667.271/0001-79	11-COMPETÊNCIA 09/2014	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 515,02	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 515,02
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2014\*\*

858000000054 150201791415 007573050870 366727100019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**FGTS**

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 28/09/2014 - 09:04:50

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PERTECNICA HSMA CONSUL PROJ LIMITADA				02-DDD/TELEFONE (0011)30612549
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 6.437,84	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 73.667.271/0001-79	11-COMPETÊNCIA 09/2014	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 515,02	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 515,02
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2014\*\*

858000000054 150201791415 007573050870 366727100019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



## Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social



Prezado Cliente PERTECNICA CONS E PROJ SC LTDA - 017366727100017900,

Seu arquivo kbjsxtf0co00009.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 28/09/2014 às 09:06.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é BEF31865.3EF144F2.8F2F3B85.F115AB26.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

### *Informações Complementares:*

NRA:KBJsSXtF0Co00009

Base de Processamento: SP

Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP

Competência : 09/2014

*Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.*

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012)

DATA: 28/09/2014

HORA: 09:04:50

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: PERTECNICA HSMA CONSUL PROJ LIMITADA

COMPETÊNCIA: 09/2014

CÓD REC: 115

FPAS: 507

INSCRIÇÃO: 73.667.271/0001-79

SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

2

REMUNERAÇÃO

6.437,84

DEPÓSITO

515,02

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

515,02

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/10/2014

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.





MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  
 GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 33.0 (14/01/2014)

DATA: 28/09/2014  
 HORA: 09:04:50  
 PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 09/2014

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	DEB FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO	
PERTECNICA HSM CONSULTORIA LIMITADA	73.667.271/0001-79	0079	2100	507		
632,95	1.596,31	0,00	0,00	2.602,65	0,00	





Emissão de comprovantes

20/09/2014 17:51:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 20/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 17.51.06  
 6806306806 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PERTECNICA C E P S-C LT  
 AGENCIA: 6806-3 CONTA: 608-4

```

=====
CODIGO DO PAGAMENTO          2100
COMPETENCIA                   08/2014
IDENTIFICADOR                 73667271000179
DATA DO PAGAMENTO            19/09/2014
VALOR DO INSS                 1.955,91
VALOR OUTRAS ENTIDADES       374,48
VALOR ATM/JUROS/MULTA        0,00
VALOR TOTAL                   2.330,39
=====
  
```

DOCUMENTO: 091902  
 AUTENTICACAO SISBB: 9.C2B.A1A.A6C.F39.DEB

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 20/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 17.51.06  
 6806306806 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PERTECNICA C E P S-C LT

```

=====
CODIGO DO PAGAMENTO          2100
COMPETENCIA                   08/2014
IDENTIFICADOR                 73667271000179
DATA DO PAGAMENTO            19/09/2014
VALOR DO INSS                 1.955,91
VALOR OUTRAS ENTIDADES       374,48
VALOR ATM/JUROS/MULTA        0,00
VALOR TOTAL                   2.330,39
=====
  
```

DOCUMENTO: 091902  
 AUTENTICACAO SISBB: 9.C2B.A1A.A6C.F39.DEB

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

Transação efetuada com sucesso por: J1950079 FRANCISCO JOSE JUSTO.



### Pagamentos com código de barras

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/10/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.35.02  
6806306806

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PERTECNICA C E P S-C LT  
AGENCIA: 6806-3 CONTA: 608-4  
EFETUADO POR: FRANCISCO J JUSTO  
=====

Convenio	PREF MUN SAO PAULO		
Codigo de Barras	81600000006-6	16050000552-7	
	01410100700-4	00023770290-7	
Data do pagamento		10/10/2014	
TRIBUTO	I.S.S. - AUTO LANÇADO.		
Valor Total		616,05	

=====

DOCUMENTO: 101001  
AUTENTICACAO SISBB:  
8.97C.A7F.523.CED.F3F

Transação efetuada com sucesso por: J1950079 FRANCISCO JOSE JUSTO.



# ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

A Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento Econômico alerta para o vencimento no dia **10/10/2014** do Imposto Sobre Serviços - ISS devido pelas sociedades de profissionais, inscritas no Cadastro de Contribuintes Mobiliários - CCM, referente ao **3º trimestre de 2014**. Para orientá-lo, neste comunicado encontra-se o documento de arrecadação que pode ser pago em qualquer estabelecimento da rede bancária autorizada.

Para efeito de cálculo do imposto devido, é indicado no campo "UNIDADES TAXADAS" o número de profissionais (sócios, empregados ou não) habilitados ao exercício da mesma atividade e que prestam serviços de forma pessoal, em nome da sociedade, assumindo responsabilidade pessoal, nos termos da legislação específica. Calcula-se o valor total a pagar por meio da multiplicação do valor unitário indicado no documento de arrecadação pela quantidade de unidades taxadas. Caso a quantidade de unidades taxadas esteja incorreta, é possível alterá-la e emitir a nova guia de pagamento no DUC.

**Forma de pagamento:** O pagamento poderá ser efetuado na rede bancária autorizada, nos terminais de autoatendimento (caixa eletrônico) ou, ainda, via internet banking **utilizando exclusivamente o código de barras impresso no próprio documento.**

Também é possível, mediante sua Senha Web ou certificado digital, acessar o **Demonstrativo Unificado do Contribuinte - DUC** no endereço <http://www.prefeitura.sp.gov.br/duc>. O DUC fornece:

- Informações sobre valores pagos relativos ao IPTU, ao ISS, à TFA, à TRSS e à TFE;
- Extrato atualizado dos débitos do contribuinte;
- Possibilidade de emissão de novo documento de arrecadação para pagamento **após o vencimento** ou **em faixa de recolhimento diversa do sugerido neste documento.**

Caso **não** possua acesso ao DUC, acessar <http://www.prefeitura.sp.gov.br> para emissão do novo documento de arrecadação. Sobre os pagamentos em atraso incidirão acréscimos legais, que serão calculados automaticamente no momento da emissão do documento.

Para informações adicionais, acessar o link: <http://www.prefeitura.sp.gov.br/suo>

**Atendimento telefônico:** 156

**Atendimento presencial:** Praça de Atendimento da Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento Econômico, localizada no Vale do Anhangabaú, 206/226 (ao lado do Viaduto do Chá). Horário de atendimento: de 2ª a 6ª feira, das 8h às 18h.

Caso o pagamento já tenha sido efetuado, desconsiderar este comunicado.

**A falta de pagamento do tributo nos prazos regulamentares sujeita a inclusão do nome do contribuinte no Cadastro Informativo Municipal - CADIN MUNICIPAL, nos termos da Lei nº 14.094, de 06/12/05.**

0020621

20666 22141049 1

Emissão: 21/08/2014

## ISS 2014 - SOCIEDADE DE PROFISSIONAIS

CCM <b>2.214.104-9</b>	CNPJ <b>73.667.271/0001-79</b>	RAZÃO SOCIAL <b>PERTECNICA CONSULTORIA E PROJETOS SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA</b>			
ENDEREÇO <b>R CONEGO EUGENIO LEITE 623 CONJ 42</b>		BAIRRO <b>PINHEIROS</b>	CEP <b>05414-011</b>		
CÓDIGO DE SERVIÇO <b>01546</b>	DESCRIÇÃO <b>ENG, AGRONOMIA, ARQUIT., URBAN. E CONG.(REG. ESPEC.-SD.)</b>				
TRIMESTRE <b>TERCEIRO</b>	INCIDÊNCIA <b>09/2014</b>	VENCIMENTO <b>10/10/2014</b>	VALOR DO ISS POR PROFISSIONAL (R\$) <b>205,35</b>	UNIDADES TAXADAS <b>3</b>	VALOR A PAGAR (R\$) <b>616,05</b>

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1123 55 07 000002377029 0 8

VIA CONTRIBUINTE

816000000066 160500005527 014101007004 000237702907





**PREFEITURA DE SÃO PAULO**  
FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

DATA DE VALIDADE  
**10/10/2014**

CÓDIGO DE SERVIÇO  
**01546**

INCIDÊNCIA  
**09/2014**

VALOR DO ISS POR PROFISSIONAL (R\$)  
**205,35**

**ISS 2014 - SOCIEDADE DE PROFISSIONAIS**

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

**3º TRIMESTRE**

CCM  
**2.214.104-9**

X

UNIDADES TAXADAS  
**3**

=

Valor a Pagar (R\$)  
**616,05**

**Data de Vencimento**  
**10/10/2014**

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1123 55 07 000002377029 0 8

VIA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA

816000000066 160500005527 014101007004 000237702907





**Prefeitura do Município de São Paulo**  
Secretaria Municipal de Finanças  
Departamento de Arrecadação e Cobrança



### Declaração Cadastral

Declaração nº : i 002971/2014  
Nome/Razão Social : PERTECNICA CONSULTORIA E PROJETOS SOCIEDADE  
SIMPLES LIMITADA  
C.C.M. : 2.214.104-9

O contribuinte em epígrafe encontra-se enquadrado, para fins do disposto no art. 10 da Lei nº 13.701, de 24 de dezembro de 2003, na condição abaixo indicada:

**Sociedade constituída na forma do parágrafo 1º do artigo 15º da Lei nº 13.701/03.**

Emitida via Internet em : 15/04/2014

#### Observações:

Esta declaração possui validade de três meses a contar de sua data de expedição.

**Esta declaração não possui validade como certidão negativa de tributos mobiliários. Certidões on line de tributos mobiliários devem ser requeridas no site "[http://www3.prefeitura.sp.gov.br/certidao/ctm\\_menu.htm](http://www3.prefeitura.sp.gov.br/certidao/ctm_menu.htm)".**

**A autenticidade desta declaração poderá ser confirmada no site da Prefeitura de São Paulo (<http://www.prefeitura.sp.gov.br>).**



**Prefeitura do Município de São Paulo**  
Secretaria Municipal de Finanças  
Departamento de Arrecadação e Cobrança

**Declaração Cadastral**

Declaração nº : **I 006328/2014**  
Nome/Razão Social : **PERTECNICA HSMA CONSULTORIA E PROJETOS LIMITADA**  
C.C.M. : **2.214.104-9**

O contribuinte em epígrafe encontra-se enquadrado, para fins do disposto no art. 10 da Lei nº 13.701, de 24 de dezembro de 2003, na condição abaixo indicada:

**Sociedade constituída na forma do parágrafo 1º do artigo 15º da Lei nº 13.701/03.**

Emitida via Internet em : **22/08/2014**

Observações:

Esta declaração possui validade de três meses a contar de sua data de expedição.

**Esta declaração não possui validade como certidão negativa de tributos mobiliários. Certidões on line de tributos mobiliários devem ser requeridas no site "[http://www3.prefeitura.sp.gov.br/certidao/ctm\\_menu.htm](http://www3.prefeitura.sp.gov.br/certidao/ctm_menu.htm)".**

**A autenticidade desta declaração poderá ser confirmada no site da Prefeitura de São Paulo (<http://www.prefeitura.sp.gov.br>).**



 <b>PERTÉCNICA</b> <b>HSMA Consultoria e Projetos Ltda.</b>  Rua Cônego Eugênio Leite, 623 - Cj. 42 CEP 05414-011 - Pinheiros São Paulo - SP Fone (11) 3081.9559 / Fax (11) 3081.8052	<b>NOTA DE DÉBITO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS nº 237</b>	
	CNPJ nº 73.667.271/0001-79	IM nº 2.214.104-9
	Natureza da operação: Prestação de serviços	
	Prestação de serviços: Consultoria e projetos	
	Data da emissão: 13/10/2014	
Vencimento: conf. contr.		

Isento da emissão de Nota Fiscal de acordo com Art. 15, § 3º, da Lei Municipal nº 13.701/03 de 24/12/2.003
Imposto Sobre Serviços de acordo com Art. 10, da Lei Municipal nº 13.701/03 de 24/12/2.003

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO		
<b>Nome:</b> Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Taquaritinga - SAAET		
<b>CNPJ:</b> 45.374.865/0001-56	<b>IE:</b> -	<b>IM:</b> -
<b>Endereço:</b> Rua Clineu Braga de Magalhães, 911	<b>CEP:</b> 15900-000	
<b>Município:</b> Taquaritinga	<b>Estado:</b> SP	

Deve(m) a PERTÉCNICA HSMA Consultoria e Projetos Ltda., estabelecida no endereço acima, a importância no valor de R\$ 40.138,63 (quarenta mil, cento e trinta e oito reais e sessenta e três centavos), pagável na praça de São Paulo.

UNID.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS (R\$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
		Contrato nº 045/2.013 - Gerenciamento de Obras de Saneamento / Esgotos / Estação de Tramento - ETE, na cidade de Taquaritinga - SP. Medição 08 - Serviços prestados no mês 09/2.014  - Retenções RFB: IR (1,5%) = R\$ 602,08 / PIS (0,65%) = R\$ 260,90 / COFINS (3,0%) = R\$ 1.204,16 / CSLL (1,0%) = R\$ 401,38.  <u>Dados para depósito:</u> Banco do Brasil (001) Agência nº: 6806-3 / Conta corrente nº: 608-4		40.138,63

<b>NÃO TEM VALOR COMO RECIBO</b>	Valor dos serviços (R\$)	40.138,63
	Total desta nota (R\$)	40.138,63

1ª Via: Destinatário  [X]  
 2ª Via: Emitente  [ ]  
 3ª Via: Contábil  [ ]



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA  
E ESGOTO DE TAQUARITINGA

Para: Superintendência


Re: Protocolo – PERTÉCNICA HSMA Consultoria e Projetos Ltda. – Tomada de Preços nº 01/2013 – Contrato nº 45/2013 – 9º relatório mensal dos serviços executados e nota fiscal.

Objeto: prestação de serviços técnicos especializados de engenharia no gerenciamento de obras de saneamento / esgotos / Estação de Tratamento – ETE.

Após apreciação dos documentos e relatórios protocolados nesta Autarquia pela empresa PERTÉCNICA, nada temos a opor quanto ao apresentado, bem como ao pagamento da nota de débitos de serviços profissionais nº237.

À Tesouraria para providências.

Taquaritinga, 13 de outubro de 2.014.

  
**Juliana Tinti Bizari Múcio**  
Chefe da Seção de Redes de Água e Esgoto

  
**Luiz Carlos Antonio José**  
Chefe do Setor Operacional

Protocolo 1029 / 2014

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE TAQUARITINGA  
PERTÉCNICA CONSULTORIA E PROJETOS S/S LTDA

17/10/2014

14:10:04

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO SEMANAL - 06/10/14 A



## SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE TAQUARITINGA

CONTRATO Nº 045/2013 - GERENCIAMENTO DE OBRAS DE SANEAMENTO / ESGOTOS /  
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO - ETE

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO SEMANAL – 06 A 10/10/2014

N/REF.: GE-174-RE-AS-036-R0  
TAQUARITINGA -SP  
OUTUBRO/2014



**PERTÉCNICA**



## APRESENTAÇÃO

Apresenta-se a seguir o Relatório de Acompanhamento Semanal, das atividades previstas no Gerenciamento das Obras da Estação de Tratamento de Esgotos – ETE a ser implantada para o Sistema de Esgotos Sanitários (SES) da cidade de Taquaritinga, em consonância com a Autorização de Serviço de 03/01/21014, para o Contrato nº 045/2013, firmado em 30/12/2013, entre o SAAET - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Taquaritinga e a PERTÉCNICA HSMA Consultoria e Projetos Ltda.

O principal objetivo deste relatório é propiciar ao SAAET, o acompanhamento físico das obras na semana de 06 a 10/10/2014.

## **ÍNDICE**

- 1 - DADOS DO EMPREENDIMENTO**
- 2 - ATIVIDADES NA SEMANA DE 06 A 10/10/2014**
- 3 - DOCUMENTÁRIO FOTOGRÁFICO**

1 - DADOS DO EMPREENDIMENTO

## 1 - DADOS DO EMPREENDIMENTO

- **Agente Promotor:** Governo do Estado de São Paulo / Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos / Departamento de Águas e Energia Elétrica - DAEE

- **Agente Financeiro e Técnico:** Departamento de Águas Energia Elétrica - DAEE

- **Objeto:** Obras de Implantação de Sistema de Afastamento e Tratamento de Esgotos Sanitários de Taquaritinga (Sede)

- **Recursos:**

- . Fonte: Programa Água Limpa;
- . Convênio nº 2011/33/00335.9, de 29/12/2.011;
- . Valor: R\$ 14.491.618,13 – Exercício 2011;
- . Prazo: 24 meses

- **Agente Executor:** Prefeitura Municipal de Taquaritinga - SP

- **Contrato das obras e serviços:**

- . Processo licitatório: Concorrência nº 011/12;
- . Contrato nº 194/12, de 11/12/2.012;
- . Contratado: KMG Consultoria e Engenharia Ltda.;
- . Valor: R\$ 11.431.936,13;
- . Prazo: 18 meses após Ordem de Serviço;
- . Ordem de Serviço de 17/12/2.012; Término: 18/06/2.014;
- . Aditivo contratual de valor (Termo Aditivo 001/2013): R\$ 2.817.533,01 (24,65%), em 31/12/2.013;
- . Valor contratual aditivado: R\$ 14.249.469,14;
- . Aditivo de prazo contratual (Termo Aditivo 001/201): em 11/06/2.014, prorrogado em 90 (noventa) dias a contar de 18/06/2.014.

2 – ATIVIDADES NA SEMANA DE 06 A 10/10/2014

## **2 – ATIVIDADES NA SEMANA 06 A 10/10/2014**

No período de 06 a 10/10/2014, as atividades da Gerenciadora constaram de:

### **1) Acompanhamento da construção civil das unidades**

→ Estação Elevatória Final

- Instalação do guarda corpo da unidade.

→ Filtros Biológicos

- Regularização das paredes externas dos Filtros 1 e 2.

→ Casa Desidratação de Lodo

- Instalação da talha da unidade.

→ Caixa de Fluxo

- Instalação dos guarda corpos das Caixas de Fluxo 1 e 2.

→ Estação Elevatória de Recirculação

- Instalação do guarda corpo da unidade.

### **2) Acompanhamento da instalação hidráulico – mecânica das unidades**

→ Estação Elevatória Final

- Instalação da comporta da unidade;

- Assentamento da tubulação do extravasor da caixa de entrada (EA - Ø800mm - L= 22,00m)

### **3) Acompanhamento das instalações elétricas das unidades**

→ Casa de Painel

- Instalação da luminária do abrigo do gerador junto a Casa de Painel 1.

→ Filtros Biológicos

- Instalação dos cabos dos motores dos Filtros 1 e 2.

→ Casa Desidratação de Lodo

- Instalação do decanter.


### **4) Dados Gerais**

- Em média a obra contou com 15 operários, trabalhando em 2 turnos, das 7:00 as 12:00h e 13:00 às 17:00h, sendo:

- 05 ajudantes;
- 04 pedreiros;
- 02 encarregados;
- 01 administração;
- 01 eng. Civil;
- 01 eng. Elétrico;
- 01 técnico de segurança.

- Todos operários estavam com EPI's.
- No período não ocorreram acidentes de trabalho.
- Não foram constatadas chuvas no período.
- Foram terceirizados os seguintes serviços:
  - Retroescavadeira e operador;



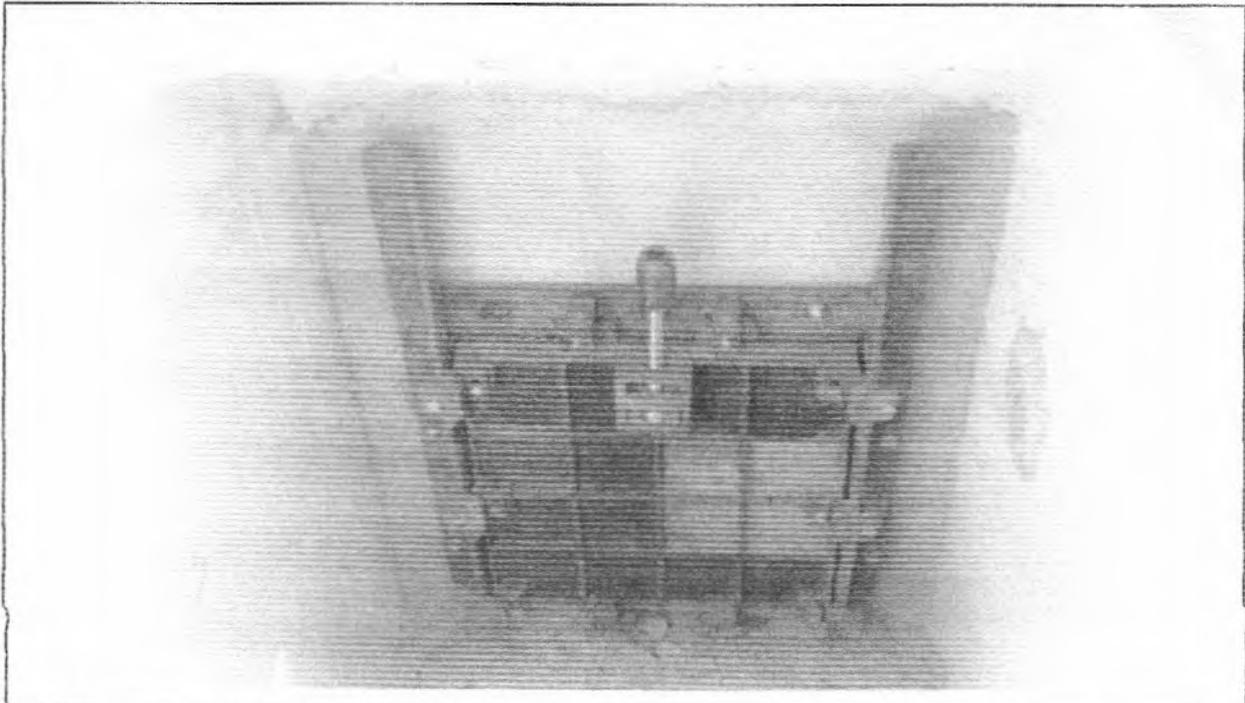


**Descrição:** Instalação da comporta da EE Final.

**Foto:** 01

**Data:** 10/10/14

**Arquivo:** 095126

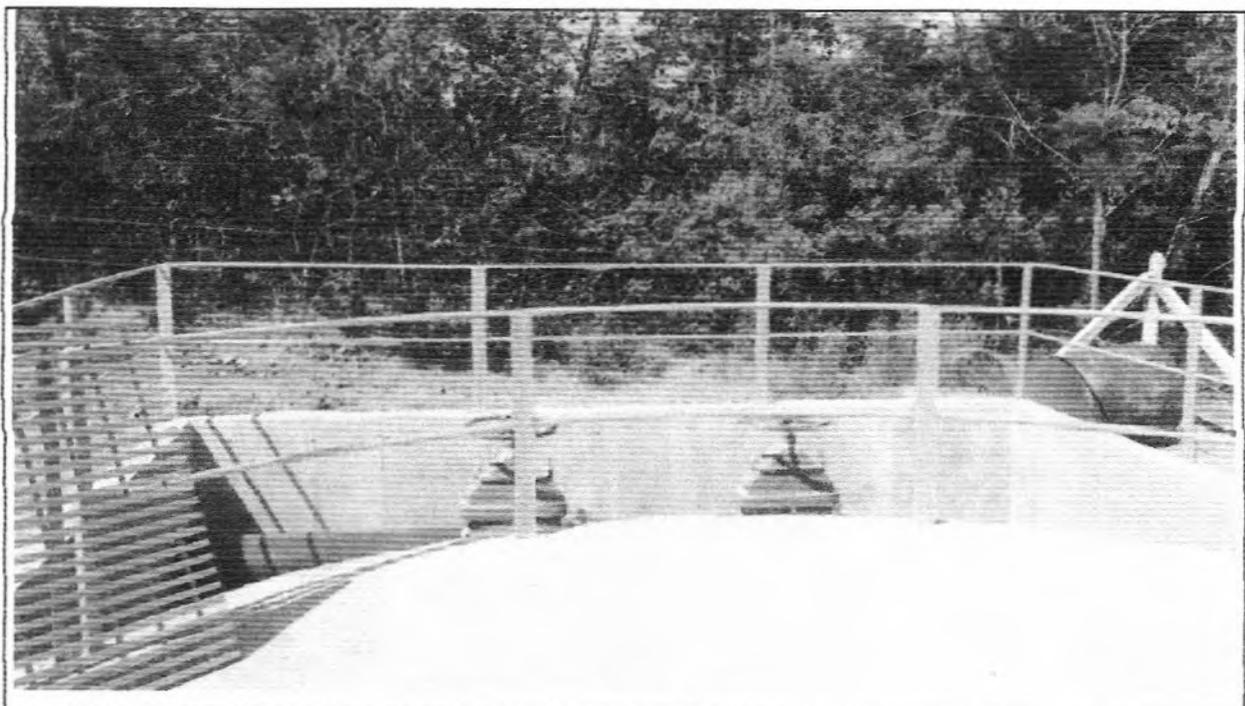


**Descrição:** Instalação do guarda corpo da EE Final.

**Foto:** 02

**Data:** 10/10/14

**Arquivo:** 095140

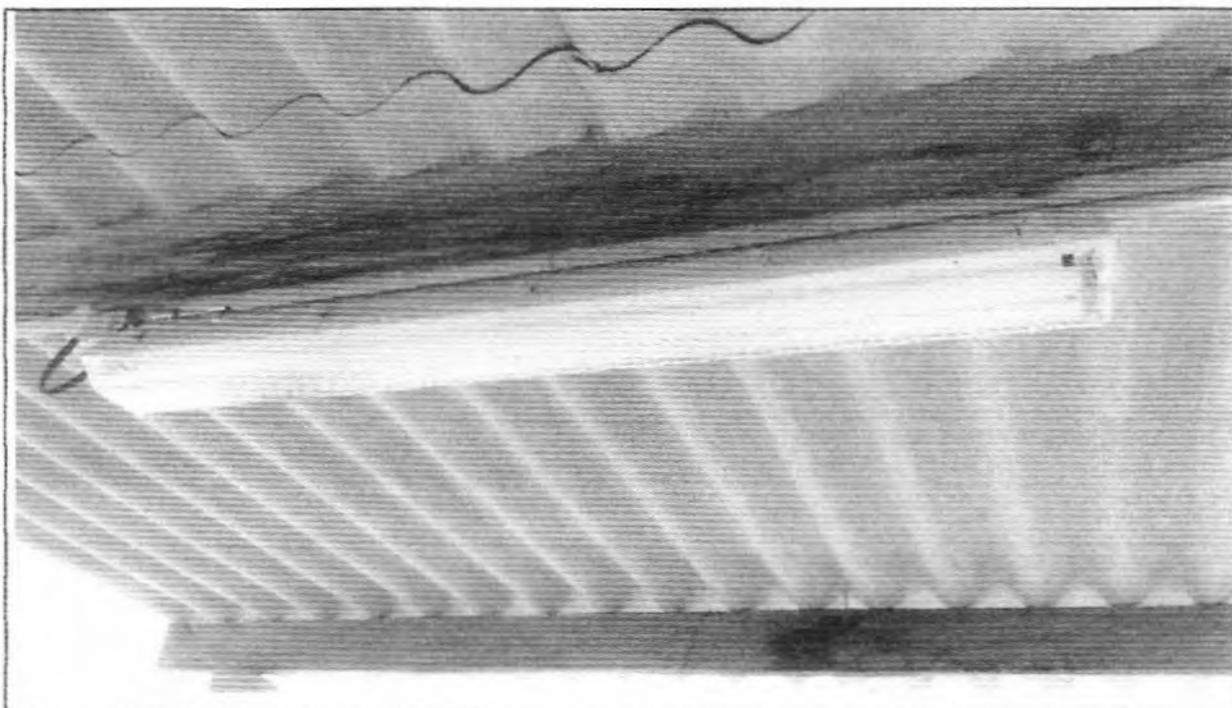


**Descrição:** Instalação da luminária do abrigo do gerador junto a Casa de Painei 1.

**Foto:** 03

**Data:** 10/10/14

**Arquivo:** 095432

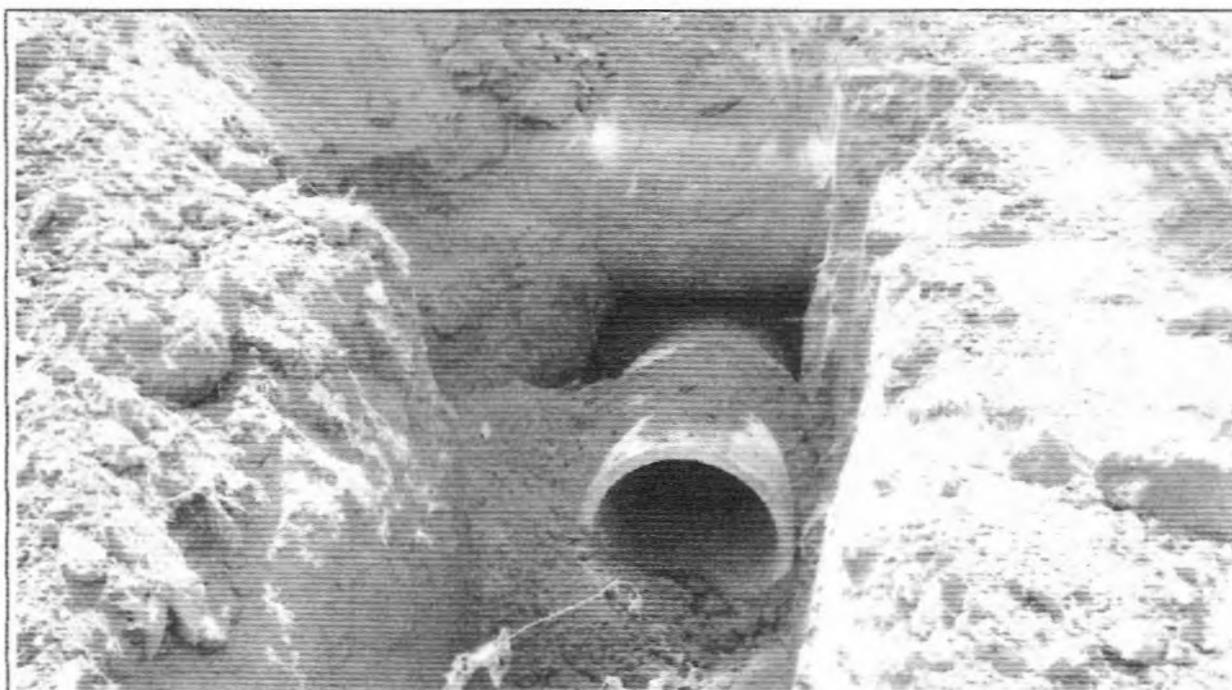


**Descrição:** Assentamento da tubulação do extravasor da caixa de entrada da EE Final.

**Foto:** 04

**Data:** 10/10/14

**Arquivo:** 100155

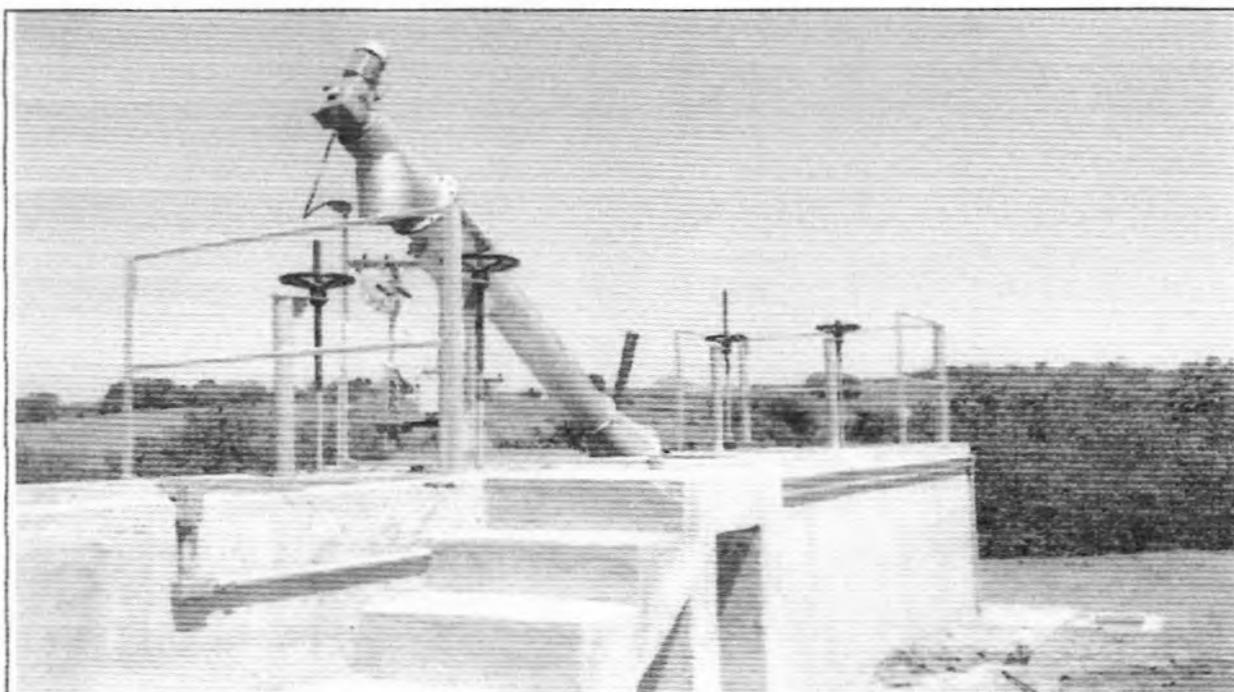


**Descrição:** Instalação do guarda corpo do Desarenador.

**Foto:** 05

**Data:** 10/10/14

**Arquivo:** 102224

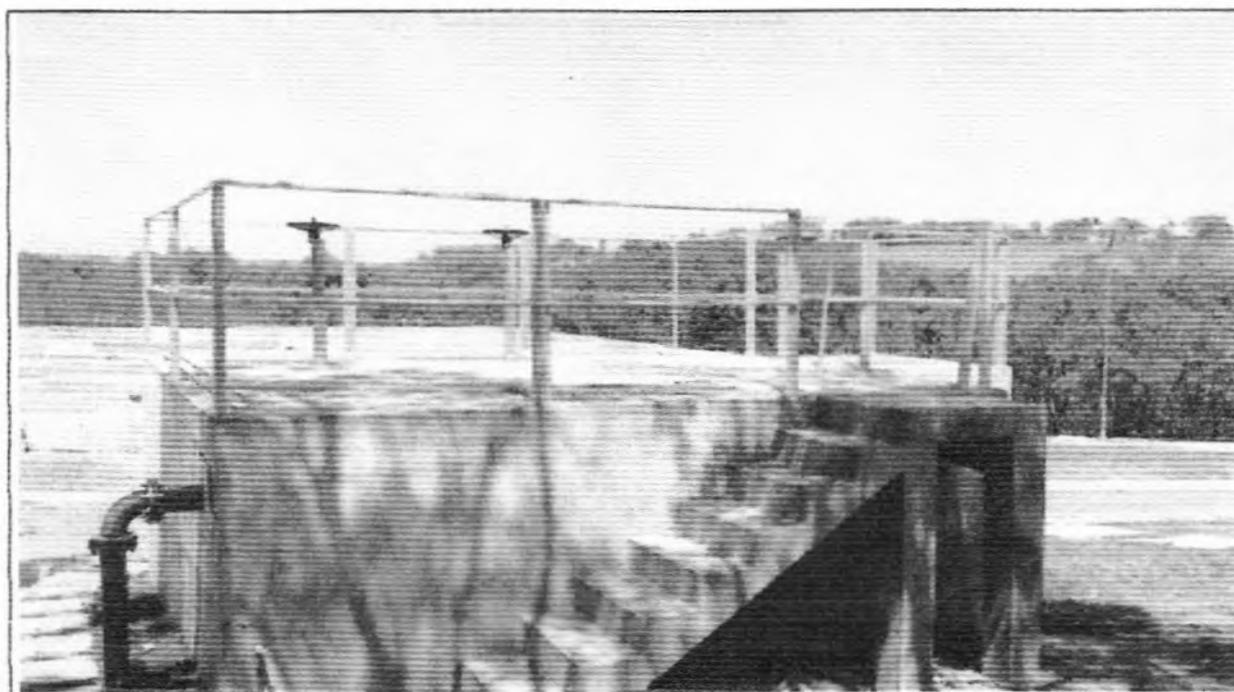


**Descrição:** Instalação do guarda corpo da Caixa de Fluxo 1.

**Foto:** 06

**Data:** 10/10/14

**Arquivo:** 102304

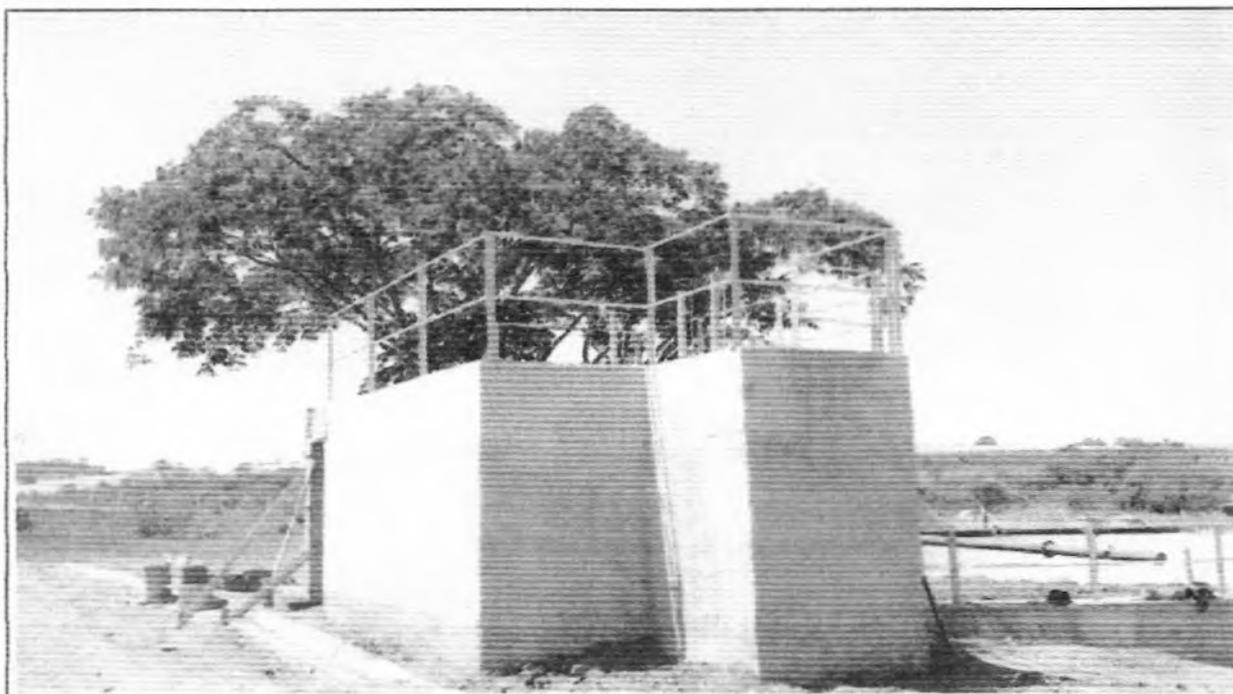


**Descrição:** Instalação do guarda corpo da Caixa de Fluxo 2.

**Foto:** 07

**Data:** 10/10/14

**Arquivo:** 102434

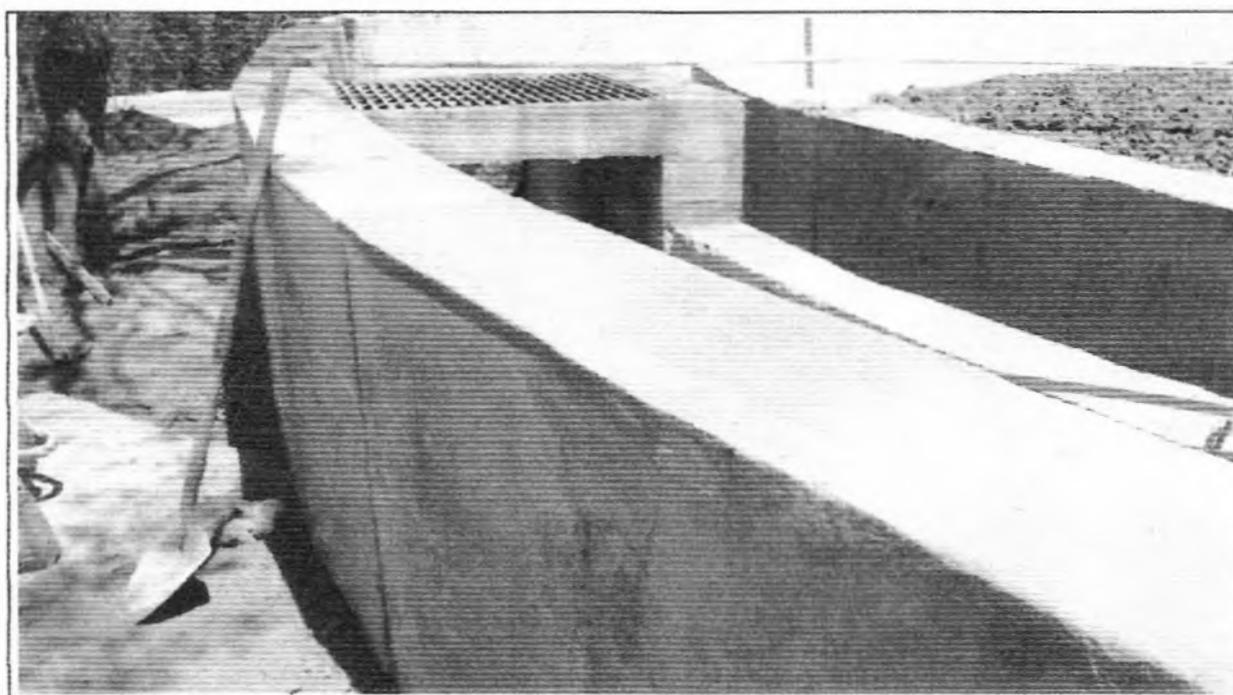


**Descrição:** Regularização das paredes externas do Filtro 1

**Foto:** 08

**Data:** 10/10/14

**Arquivo:** 102513

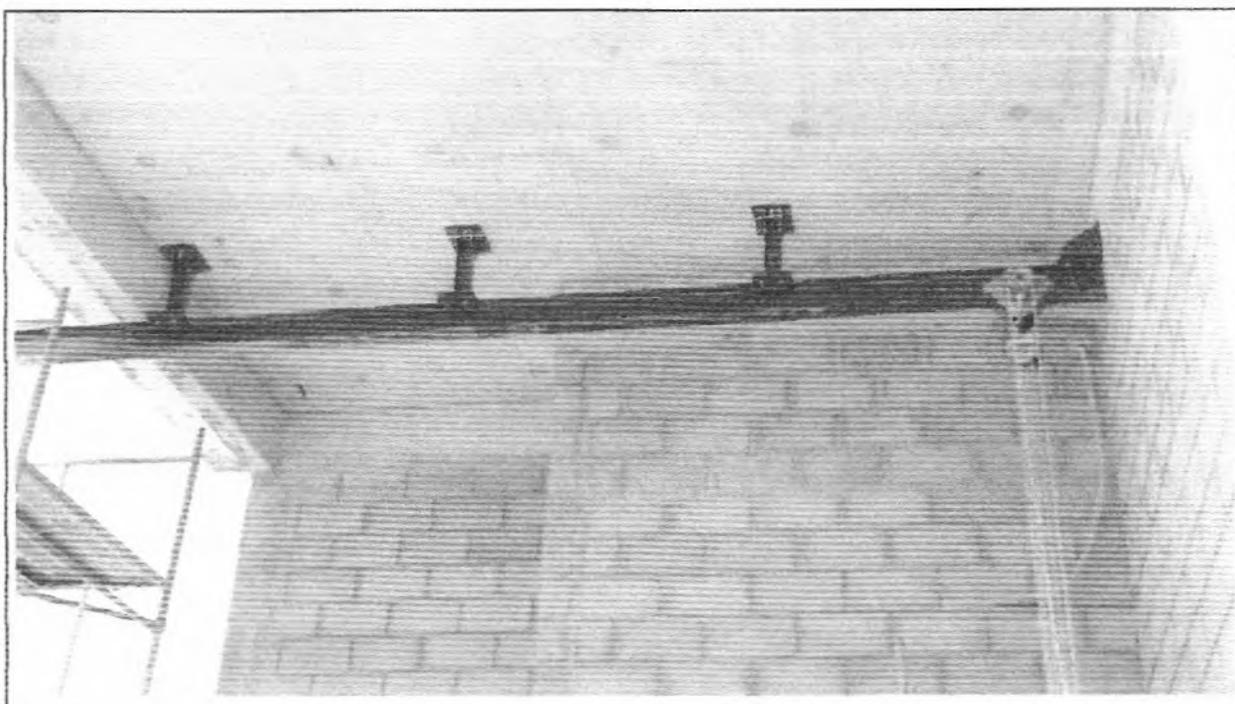


**Descrição:** Instalação da talha da Casa Desidratação de Lodo.

**Foto:** 09

**Data:** 10/10/14

**Arquivo:** 102601

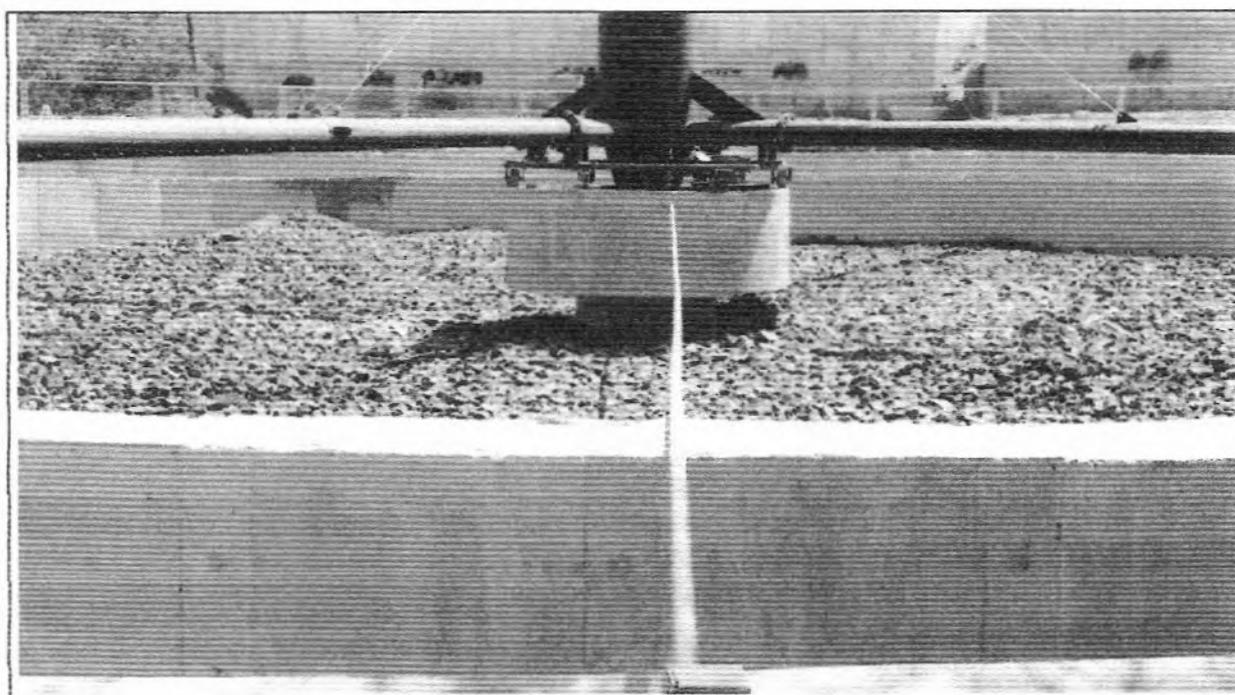

**Descrição:** Instalação dos cabos do motor do Filtro 1

**Foto:** 10

**Data:** 10/10/14

**Arquivo:** 102644
